

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目


编号：ZHJL-CSGF-TZ-003

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：关于机械区基础问题

内容：我监理部对现场尽行巡视发现以下问题：

机械厂区个别独立基下未做垫层处理以至于架空，靠近墙体部分回填未做压实处理会对独基浇筑后产生沉降，现要求施工单位对架空独基点位采取回填处理，对回填部分压实后方可浇筑，现施工单位针对以上问题两日之内进行整改完成，未整改完成该点位不许施工。

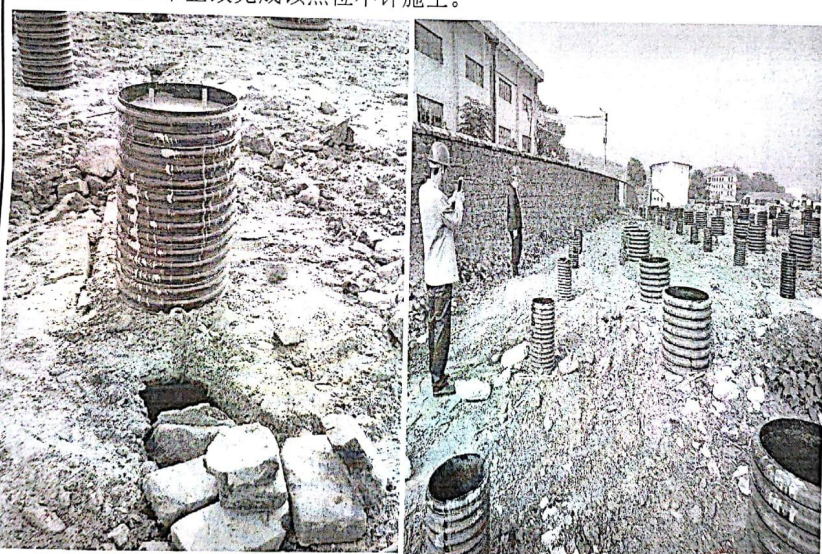

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任志云

日期：2018年6月11日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
