

监理通知单

工程名称：白沙光伏发电项目



编号：ZHJL-CSGF-TZ-017

致：湖南红太阳能源科技有限公司施工项目部：

事由：关于接地扁钢焊接

内容：

我监理部对现场巡视检查，机械区与供销区在焊接接地环网时发现扁钢施焊时不符合设计规范及施工要求，机械区个别焊接部位未涂环氧煤沥青漆；供销区焊接后对扁钢未进行除焊渣并进行防腐的处理，现对你施工单位提出接地必须按照施工规范施工，对焊接部位除去焊渣，埋地部分进行环氧煤沥青防腐，±0 之上的接地扁钢刷黄绿漆，对焊接长度不到位的扁钢进行加长焊接，埋地前应通知三方检验，合格后方可回填。

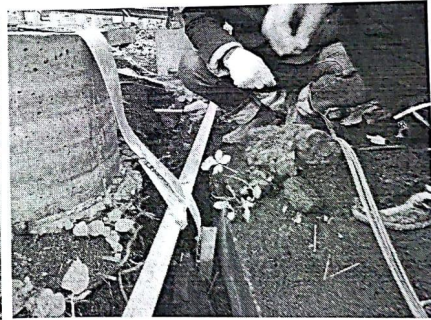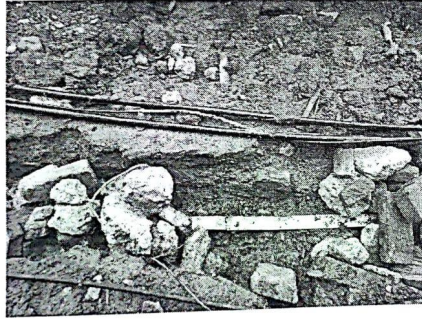

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李守明

日期：2018年11月19日

本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。
