

监理通知单



工程名称：江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSTZ-001

致：江苏腾盛纺织光伏发电项目施工项目部：

事由：关于夹具中压边压长度事由

内容：2018 年 10 月 13 日我监理部监理人员对本项目 1# 厂房支架安装施工进行巡视，巡视中发现屋面所使用的夹具，中边压长度与施工合同技术协议中铝合金支架部分，所要求的长度不一致，合同要求长度大于等于 60mm，现场实际为 50mm，现我方要求贵方对现场不满足合同要求的中边压夹具等进行更换处理，并要求对以后进场材料设备按照合同执行，如不执行对造成的损失均由·你方负责。

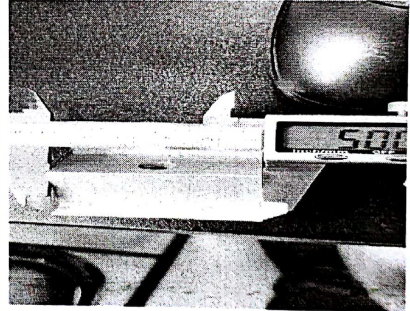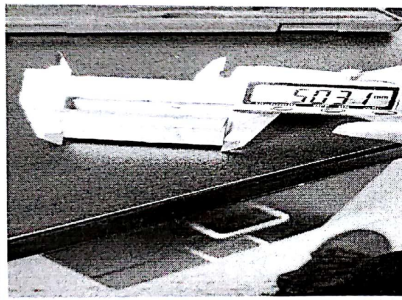

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 10 月 14 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
