

## 监理通知单

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJTZ-001

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场安全防护及文明施工的问题

内容：

- 1.屋面爬梯与地面夹角角度较大，跨步间距较大，下女儿墙处未安装爬梯；
- 2.屋面女儿墙低于 1.2m 处未安装安全防护网；
- 3.厂房钢结构加固施工过程中，施工人员安全防护不到位，施工部位下方未设置安全警示线；
- 4.施工人员未佩戴劳保用品。

现要求你单位对以上问题进行整改，整改要求如下：

- 1.爬梯与地面夹角应在  $45^{\circ}$  ~ $60^{\circ}$  之内，跨步间距应在 200mm~250mm 之内，下女儿墙处安装爬梯；
- 2.屋顶女儿墙低于 1.2m 处安装安全防护网；
- 3.钢结构加固施工过程中，施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带；施工部位下方设置安全警示线，避免落物；
- 4.所有施工人员都必须穿戴劳保用品（反光衣）。

以上问题要求你单位 2 天之内整改完成，并报验监理部。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附：现场照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：徐耀生


日

期：2018.11.15


注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。




爬梯与地面角度较大

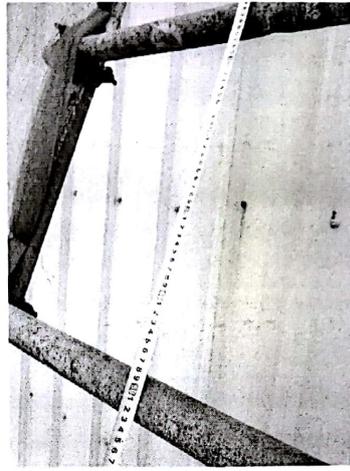

跨步间距较大

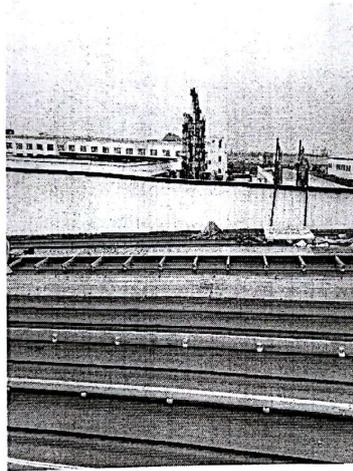

屋面女儿墙低于 1.2m 处未设置安全防护

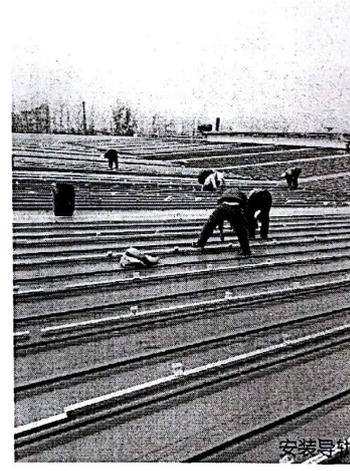

施工人员未穿戴劳保衣
