

监理通知单

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJTZ-003

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司 施工项目部

事由：关于电缆敷设及桥架安装的问题

2018年12月09日下午14时，我监理部人员巡视检查现场电缆敷设及桥架安装，发现以下问题：

1. 现场施工人员野蛮施工，现场未见电气专业管理人员，电缆敷设过程中导致电缆损坏；
2. 电缆敷设转弯半径不符合 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》；
3. 桥架安装不符合规范要求，个别转弯处未安装转接头。

现要求你单位对以上问题进行整改，整改要求如下：

1. 施工前对现场施工人员做好技术交底工作，并配备专业的电气管理人员；
2. 对已损坏的电缆采取合理有效的处理办法；
3. 电缆敷设必须符合 GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》；
4. 桥架安装转弯处必须安装转接头。

以上问题要求你单位 2 天之内整改完成，并报验监理部。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附：现场照片

项目监理机构（章）：


总/专业监理工程师：徐耀生

日

期：2018.12.09



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

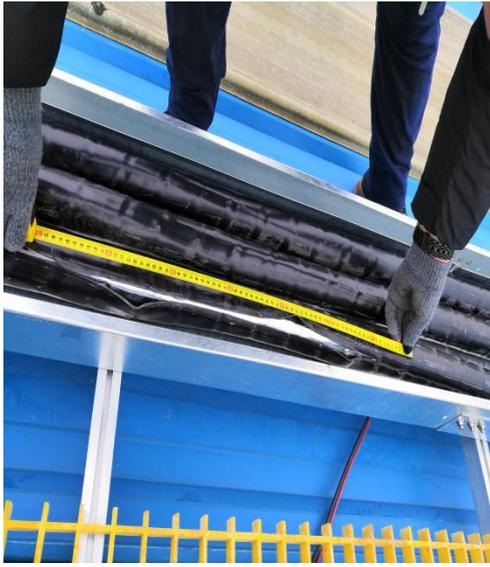

电缆损坏



电缆转弯半径不够、桥架转弯处未设置转接头
