

监 理 通 知 单

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目


编号：JXM7-001

致：泰州市振发建设工程有限公司施工项目部

事由：关于组件安装存在的问题

内容：

在组件安装过程中，发现部分组件压块没有加装防雷垫片，不能有效刺穿垫板及组件边框阳极氧化膜，组件边框和檩条不能有效连接，不能保证组件边框有效接地。要求你项目部及时进行整改，并做好相应的技术交底，避免问题再次发生，整改后报监理项目部进行确认。

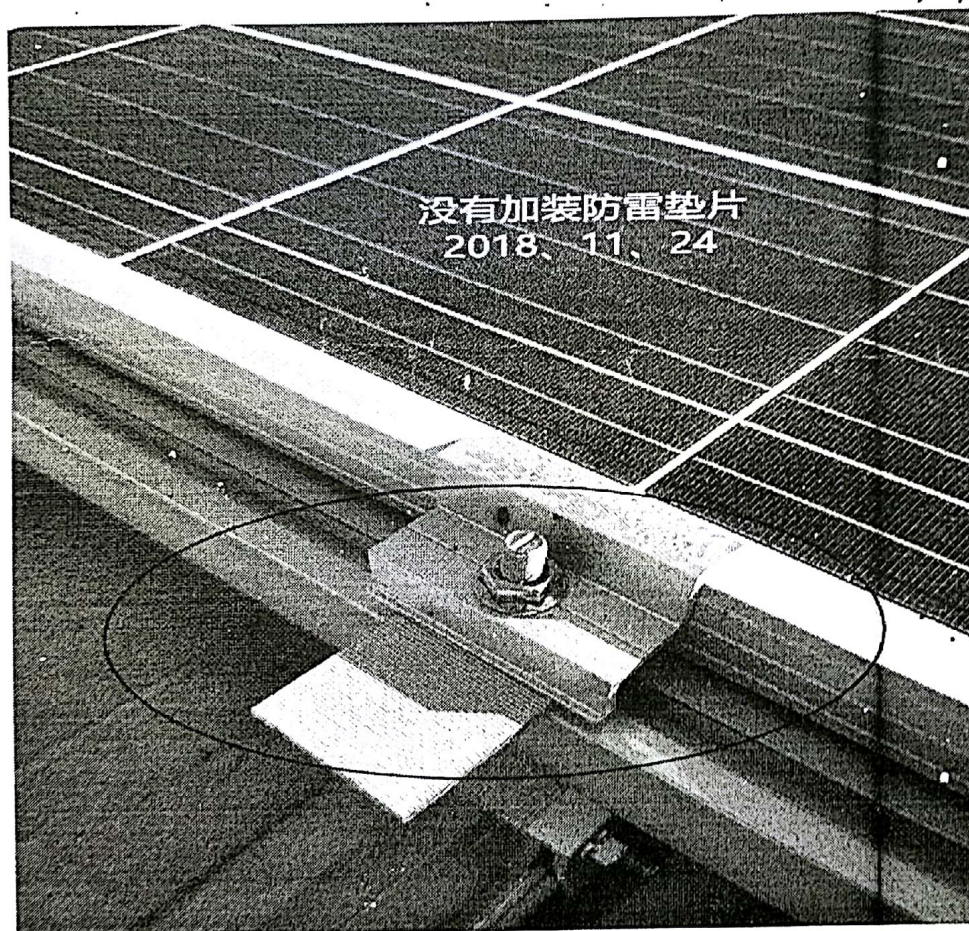

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

2018年11月24日

监理项目部
