

监理工程师通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号：PGFD-ZL-ZHJL-007

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

主题：关于 K04 基础灰土桩施工事宜

经我监理项目部专业监理工程师现场巡视检查发现：你单位在 k04 风机基础灰土桩施工过程中，灰土桩桩孔深度为 0.8~2.3M，与设计施工图纸要求深度严重不符（图纸设计深度为 6.4 米），现要求你单位暂停灰土桩施工，重新打孔自检合格后报监理检查，复检合格后再进行施工。

以上问题立即整改于 2019 年 5 月 20 日前回复

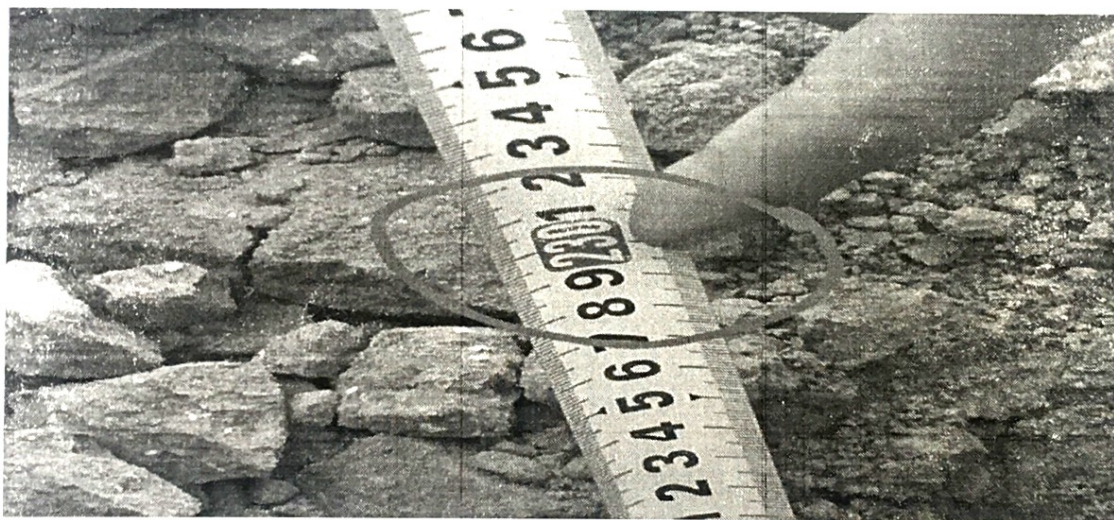

项目监理机：（章）



总/专业监理工程师：（签字）

李俊

2019 年 5 月 14 日
