

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-026

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 风电项目总包项目部


主题：关于 F19 号风机吊装前塔筒油污清理事宜

内容：

我监理工程师巡视检查发现以下问题：

F19 号风机塔筒有大面积油污，需清理干净，有油漆缺失的部位补全后方可吊装。每道工序完成后质量员要做好自验工作，符合要求后再报监理验收，资料也要同步跟上。

望你部接通知单后认真对照整改，整改后再报监理复查，确保质量符合规范及设计要求，请在 7 月 31 日前书面回复。

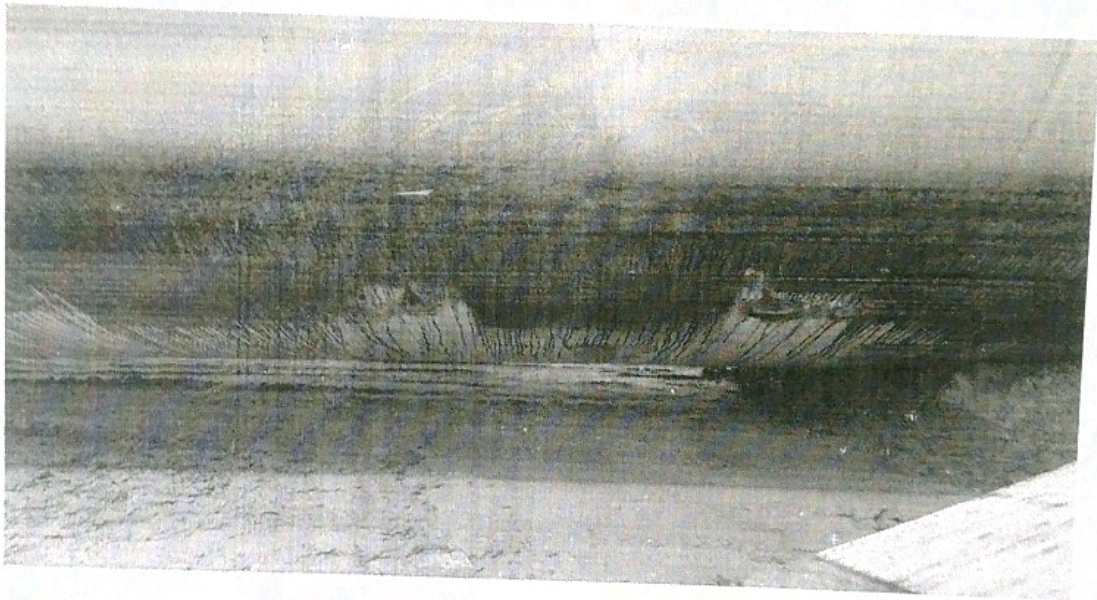

项目监理机构：（章）
总/专业监理工程师（签字）：[Signature]
2019 年 07 月 29 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。
