

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-034

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部


事由：关于升压站生产控制楼屋面保温问题施工事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现问题：

- 1、监理现场巡视检查发现，进场保温材料挤塑板没有进行见证取样送检。
- 2、屋面找坡所用的煤灰渣材料 and 水泥配合比不符合要求，煤灰粒径有过大的，保证不了工程质量。要求施工单位接到通知立即整改。

以上问题要求施工单位在 1 日返工整改，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并书面回复，经验收合格后方可继续施工。

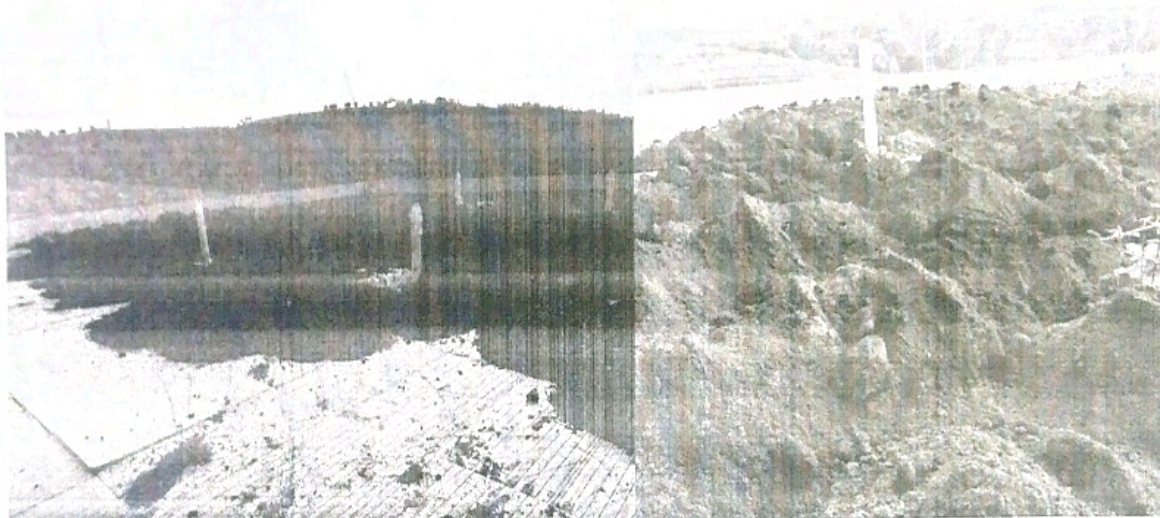

项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）



2019 年 09 月 07 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
