

监 理 通 知 单


工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-003

致：信邦建设集团有限公司

事由：12#屋顶基础排布相关事宜

内容：你单位所承建的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：今日我监理方现场巡视时发现，你单位正在施工的 12#屋顶，由于屋面存在防水设施，致使屋面光伏基础排布高低不平，会导致光伏支架无法正常安装（附图）

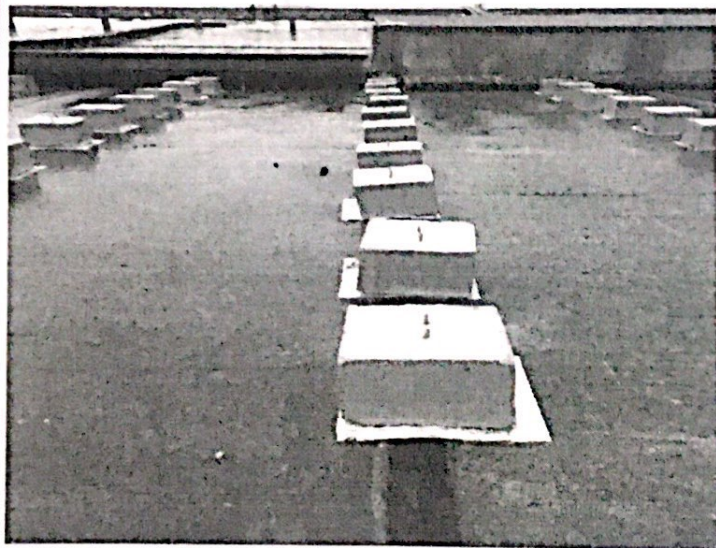

现要求你方尽快进行整改，整改完毕后复验合格，方可进行下一道工序

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年12月10日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
