

监 理 通 知 单

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-TZD-002

致: 中机国能浙江工程有限公司

事由: 关于施工现场混凝土支墩施工质量事宜。

内容: 我监理项目部对贵单位混凝土支墩施工检查过程中,发现存在以下质量问题:

- 1、混凝土支墩浇筑后,未经报验拆模,拆模过早,影响支墩强度,出现啃边问题,不符合规范要求,要求按相关规范要求拆模,浇筑前模板隔离剂涂抹到位,拆模时禁止人员踩踏。
- 2、支墩浇筑时振捣不到位,出现蜂窝麻面问题,且表面出现漏石子现象,要求浇筑时振捣到位,表面收光抹平。
- 3、要求做好养护措施,养护到位,确保砼支墩强度。

要求: 以上问题要求你单位限期两日内整改完成,自检合格后报监理复查,不合格的不予使用,要求你单位在通知单回复时,详细阐述,问题整改采取的纠正措施、整改经过和整改效果。(详见附图)

特此通知!

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期:

10/8

年

11


月

25

日

注 本表一式__3__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

附图一:

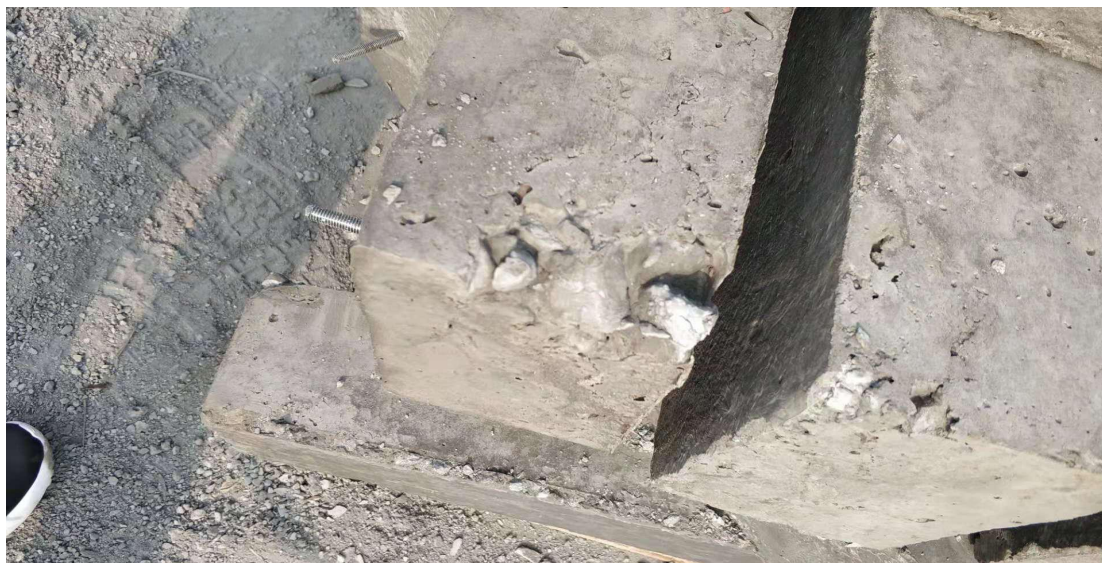

附图二:




附图三:



附图四：



附图五：

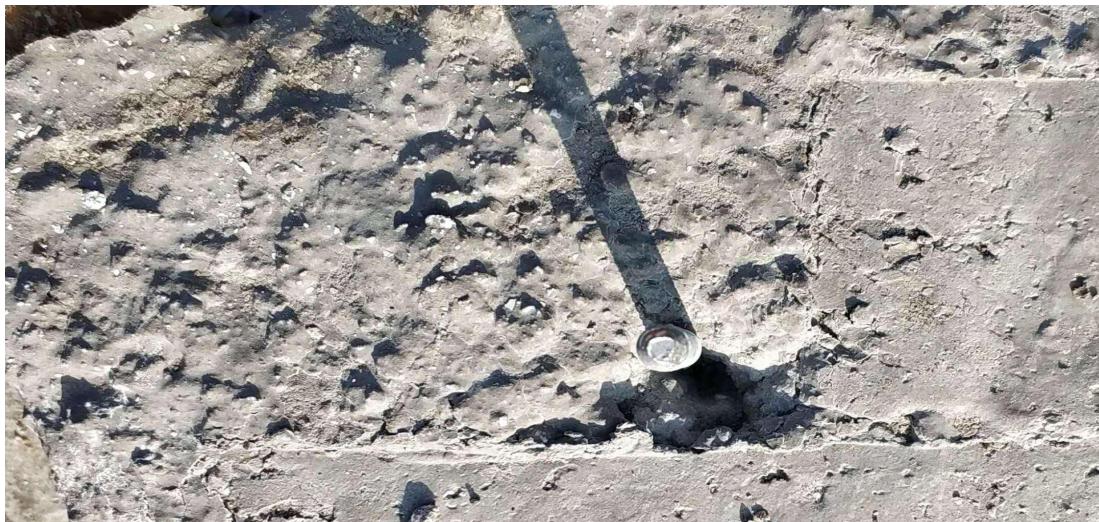

附图六：

