

监理工程师通知单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

主题：关于施工单位现场施工检查，存在安全相关事宜

内容：

2019年05月12日，经业主、监理在海力物流（A1）屋面巡视发现，现场施工存在以下安全事宜：

- 1、东厂区海力物流（A1）屋面施工安全通道板需要加固；
- 2、部分施工人员上屋面施工，安全带未扣在安全绳上（缠绕在身上）。
- 3、已安装完毕的夹具、导轨屋面采光带，安全网拆除后采光带临边需做安全警示标识，严禁在未挂安全网的区域作业。

- 4、现场安全文明施工需加强管理，当天施工产生的垃圾，下班前及时清理出场。

针对以上问题，现要求施工单位暂缓安装施工，先把安全防护措施整改完成后，报监理、业主复查合格后方可正常施工。同时要求中机国际现场管理人员、安全员严格执行安全方案制定的安全措施，加强人员安全意识教育，严格监督检查安全设施落实情况和安全防护用品正确使用情况。

限期1日内整改完成并回复监理方。

后附不规范相片

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日




注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份


问题一：施工安全通道板未固定



问题二：施工人员安全带未扣在安全绳上

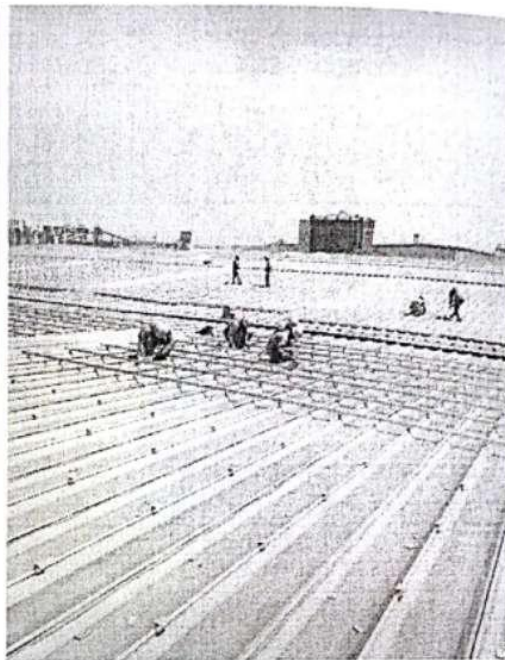

问题三：上屋面爬梯存在安全隐患（加固不牢固）

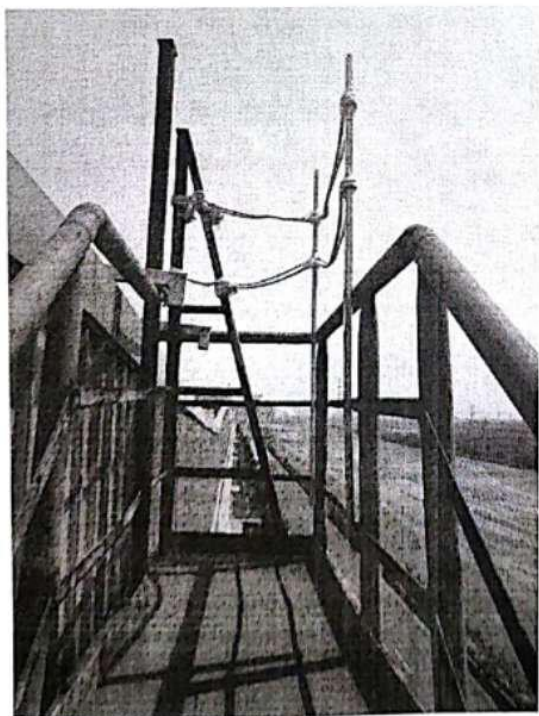

问题四：安装完成夹具、导轨的区域
采光带上安全网被拆除

