

监理工程师通知单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-TZD-003

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

抄送：张家港科电能源科技有限公司沙钢项目部

主题：关于现场施工检查，存在的除锈、防腐相关事宜

内容：

2019年05月17日，经业主、监理在宽厚板（B1）屋面巡视发现，现场施工存在以下事宜：

- 1、个别施工点除锈后防腐不到位（漏刷）；个别除锈点防腐漆刷了一次（要求两遍）；
- 2、个别施工点未除锈直接刷防腐漆；
- 3、部分施工点彩钢瓦已生锈，且未除锈、未做防腐的情况下已安装夹具、导轨；

针对以上问题，要求对不符合要求的施工点进行返工、拆除，整改完成后报监理复验合格后再进行下一道工序；中机国际现场管理人员，严格按施工方案制定的措施进行现场作业监督，同时对施工人员做好技术交底。

限期1日内整改完成并回复监理方。

后附不规范相片

项目监理部（章）：


总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份

问题一：在未除锈的情况下进行防腐

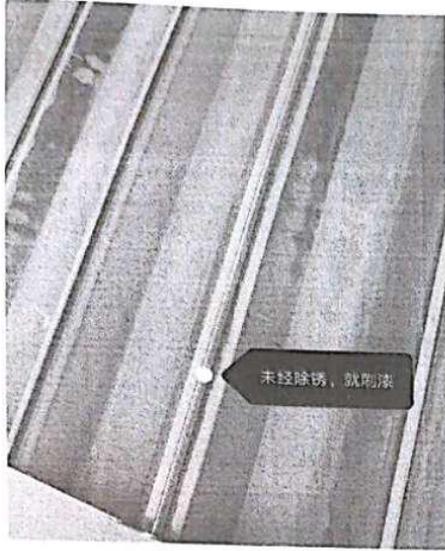

问题二：防腐不到位存在漏刷现象



问题三：在未除锈的情况下安装夹具、支架

