

监理工程师通知单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-TZD-004

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司沙钢项目部

抄送：张家港科电能源科技有限公司沙钢项目部

主题：关于施工现场安全、质量等相关事宜

内容：

2019年05月23日，监理在海力物流（A1区）施工屋面巡视发现，现场施工存在以下事宜：

- 1、登高人员上屋面前，安全员没在现场交底；施工人员作业区未见现场管理人员。
- 2、现场登高作业人员（24人）与相片中（20人）及报审表内（26人）人员数量不符。
- 3、施工区域采光带安全网未拴挂在夹具上，存在安全隐患。
- 4、第13垮安全网未拴挂就进入施工状态，存在较大安全隐患。
- 5、个别施工人员安全带上的安全绳挂钩保险卡套丢失（不能再次使用），必须更换新的安全带。

6、已完成安装支架的区域，自检整改不到位（还存在较多质量问题），要求在安装组件前做好三级自检，整改合格后再报监理、业主做分项工程验收，验收合格后方可转入下一道工序施工。

现要求暂缓现场施工，针对上述问题逐一整改完成后，报监理、业主复验合格再进入正常施工；同时望总包单位切实严加管控好现场安全、质量等相关事宜！

后附不规范相片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份


问题一：登高人员数量与报审表内不符



问题二：安全带绳上挂钩保险卡套丢失




问题三：压块未压在导轨上

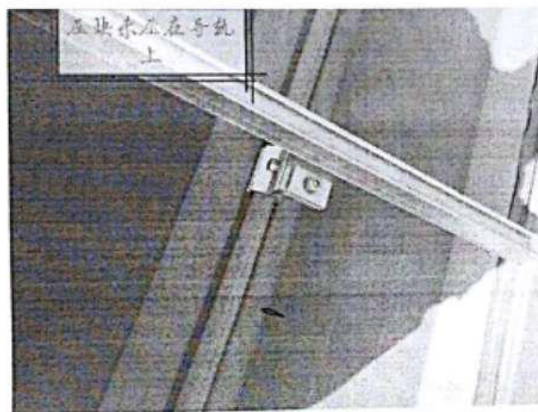

问题四：采光带未拴挂安全网已进入施工状态



问题五：采光带上安全网未可靠固定在夹具上

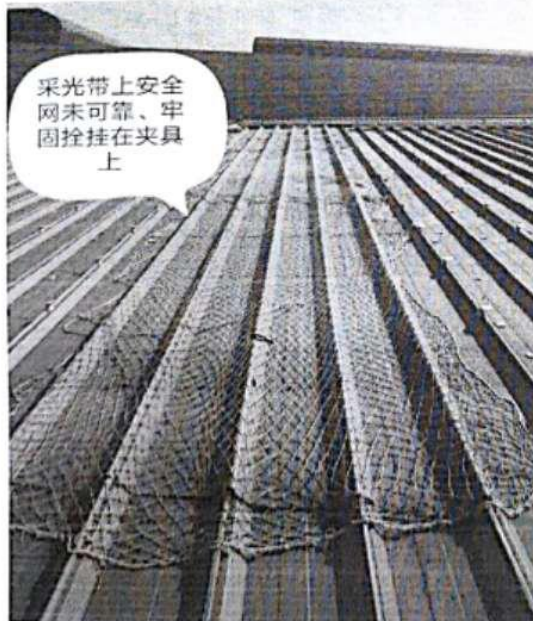

问题六：安装完成的支架存在螺栓未紧固现象

