

监理工程师通知单

工程名称: 洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: TZD-003

致: 安徽三三建设工程有限公司施工项目部

主题:

施工安全管理等事宜。

内容:

目前洛阳已进入高温季节, 工程也进入冲刺阶段, 特要求你们做好如下事宜:

一、专职安全管理人员要持证上岗, 全程安全管理, 以确保安全管理到位, 安全生产落实。

二、现场要配备仁丹、风油精、十滴水、清凉油等防暑用品, 保持饮用水充足, 夜间施工要规范安全生产, 管理人员必须有人在场。

三、积极每天做好安全施工交底工作, 检查好安全帽、安全带等要按规范使用。

四、防火工作要到位, 易燃部位防火布要全覆盖, 水、灭火器要到位, 防火专人看护, 管理人员要每天检查跟踪, 确保万无一失。

五、屋面临边及玻璃钢采光带部位临时防护要规范到位, 严禁玻璃钢瓦上行走堆料, 要常查常检。

六、严禁喝酒进入施工现场, 禁止屋面大小便, 吸烟到厂部指定处去吸。

七、上屋面材料要及时分散, 分散堆放也要得体有序, 临边不得堆放材料, 垃圾要及时清理, 不用的袋、箱、料不得留置屋面。

八、临时用电要三级配置, 特殊工种要持证上岗, 严格规范临时用电。

九、吊装作业要设置安全距离警戒线, 要有信号员指挥, 确保安全生产正常。

以上内容请逐条对照, 于二十日前回复

抄送建设单位一份

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:

程强强

2017.5.17

填报说明: 本表一式三份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

监理工程师通知回复单


工程名称: 河南洛阳交运集团 2.2MW 分布式光伏发电项目

编号: JYGF-JLHF-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 TZD-003 的监理工程师通知后, 已按要求完成了监理工程师通知单所列内容的工作, 先报上, 请予以复查。

附件: 回复材料



承包单位 (章):

项目经理: 徐青松

日期: 2019.5.19

项目监理机构复查意见:

已符合要求

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 程强强

日

期: 2019.5.19

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

监理通知单 (TZD-003) 回复材料

序号	问题	整改结果
1	专职安全管理人员要持证上岗, 全程安全管理以确保安全管理到位, 安全生产落实。	安全管理人员已到位, 在施工过程中全程在岗。
2	现场要配备风油精、人丹、十滴水、清凉油等防暑用品, 保持饮用水充足。夜间施工要规范安全生产, 管理人员必须有在场。	已配备藿香正气液、人丹防暑药品, 饮用水配备充足。
3	积极做好每天安全施工交底工作, 检查好安全帽、安全带按规范使用。	由专人现场检查, 重点部位每天施工前均进行交底。
4	防火工作要到位, 易燃部位防火布要全覆盖, 水桶、防火布、灭火器要到位, 防火专人看护管理人员要每天检查跟踪, 确保万无一失。	按着整体的防火控制区域及重点部位配备了相应的水桶、防火布、灭火器等消防器材。特殊部位采取防火布全覆盖以做到切实有效的防火作用。
5	屋面临时及玻璃钢采光带部位临时防护要规范到位, 严禁玻璃钢瓦上行走或堆料, 要常查、常检破损。	屋面防护已全面检查、整改完毕, 在施工过程中继续加强工程管理。
6	严禁酒后进入施工, 禁止屋面大小便, 吸烟到厂部制定处去吸。	已在班前会上明确规定厂区内禁止酒后上岗, 一经发现立即清除现场。随地大小便的已经发现按场内管理条例进行处罚, 吸烟到制定区域。
7	上屋面材料要及时分散, 分散堆放要得体, 有序临边不得堆放材料, 垃圾要及时清理不用的袋、料不得留置屋面。	屋面暂存的组件、电缆桥架等随存随散, 避免集中到一点。垃圾、废包装箱、纸袋等由专人及时清理。
8	临时用电要三级配置, 特殊工种要持证上岗, 严格规范用临时用电。	所有临时用电均由专业电工重新检查, 按着三级配置规范使用。特殊工种资质审查合格后持证上岗。
9	吊装作业要设置安全距离警戒线、要有信号指挥员, 确保安全生产正常。	已设置吊装安全警戒距离, 吊装时由专职司索用对讲机指挥。



防暑药品




施工重点部位全覆盖



施工重点部位全覆盖



组件吊装后及时散开

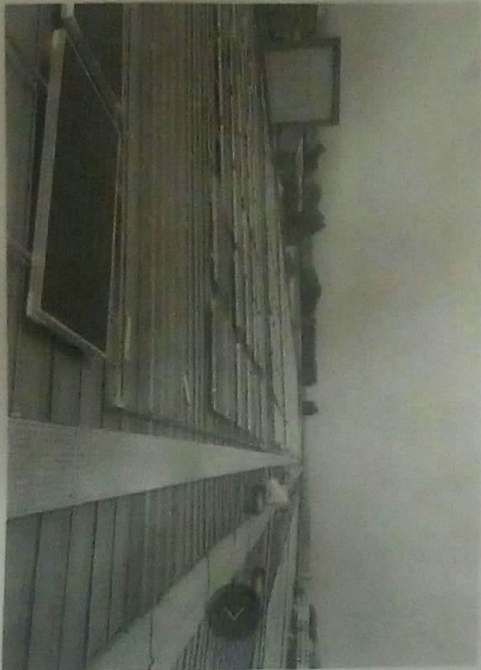

组件避免集中堆放



散开组件
