

监 理 通 知 单

工程名称:河北邢台志和玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-005


致: 微山县欢城建筑有限公司

事由: 关于结构加固施工质量问题事宜。

内容: 对贵单位 2#厂房结构加固檩条安装施工进行检查, 发现你单位部分内衬 C 型钢檩条安装不正确, 与设计图纸不符, 因厂房屋檩条尺寸偏小与设计不符造成内衬檩条无法正常安装, 而私自改变安装形式。

现要求你单位出具设计变更单报监理部审核, 按设计要求对内衬 C 型钢檩条进行二次切割加工后再进行安装, 对安装不正确的内衬檩条进行整改, 整改完成后报监理项目部复查。

附图 (安装不正确):

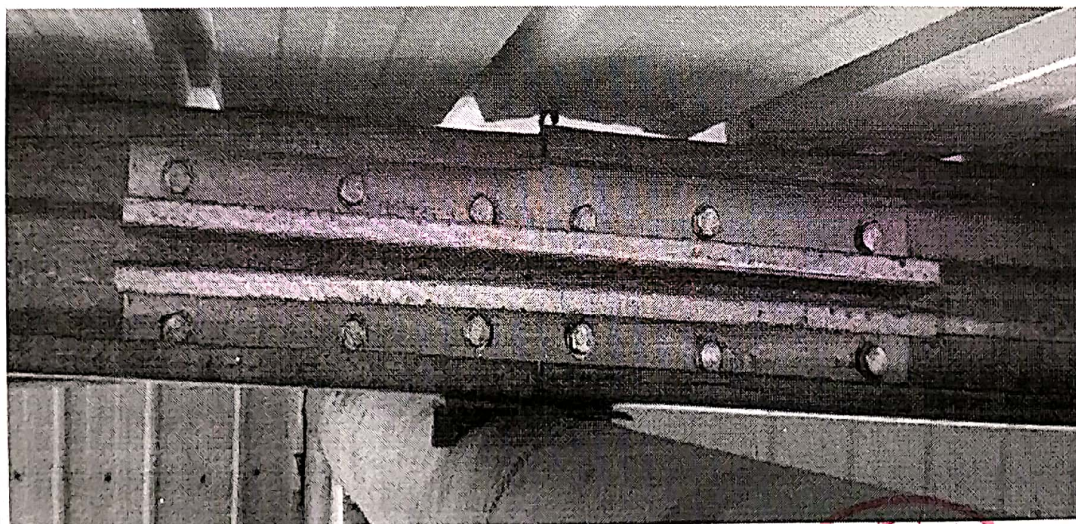

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 05 月 28 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。
