

监理工程师通知单

表号: PD-BI

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-TZD-036

至: 中州建设有限公司赫章县大山坪施工项目部;

事由: 关于升压站生活楼刮腻子相关事宜;

通知内容:

我监理项目部 2019 年 12 月 12 日在升压站生活楼室内施工过程中, 发现室内墙面刮腻子, 鉴于墙体内仍含有水分, 不具备刮腻子施工条件, 否则后期会出现墙面空鼓、脱落等现象, 建议你单位采取烘烤等措施、墙体完全干透后方可进行刮腻子施工。

此通知单送施工项目部接收, 报监理单位
负责人(杨工)签收。
附回:

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日


期: 2019年12月12日

承包单位签收:

签收人: _____

日期: _____

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设单位存 1 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 1 份。

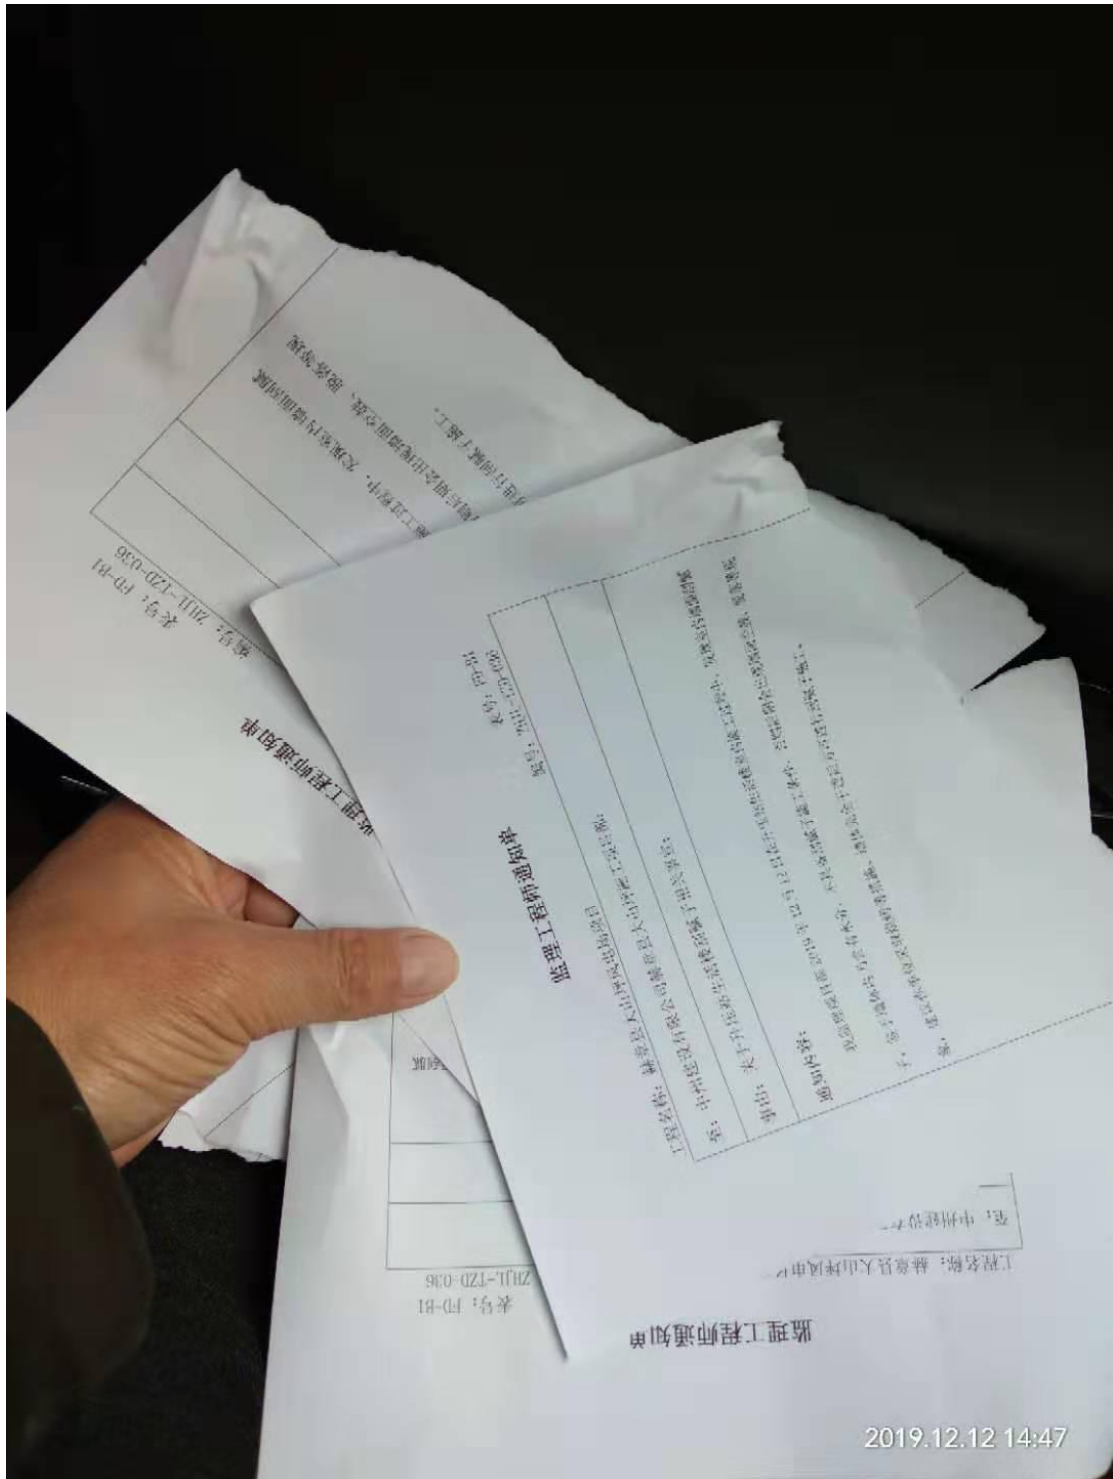

监理工程师通知单

工程名称：赫章县大山坪风市

至：中州建设

监理工程师通知单

表号：FD-B1
2019-12D-036

监理工程师通知单

表号：FD-B1
2019-12D-036

2019.12.12 14:47
