

监理通知单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：JXM7-JL-007

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：施工现场安全事宜

内容：

经监理项目部人员现场检查发现，由贵单位负责施工的华能共和 5 万千瓦风电项目场区工程现存在以下问题：

- 1、现场开挖土方应堆放于距坑边 1m 以外，且堆放高度不应超过 2m；
- 2、现场堆放土方未及时进行防尘网覆盖，且已覆盖区域防尘网存在漏盖及破损情况；
- 3、风机基坑和升压站电气楼、木工加工区等施工区域警示牌、标示牌未悬挂；
- 4、进场车辆、施工机械必须有国家有关部门的年检合格证，否则不得进入施工现场；
- 5、现场材料装卸、运输过程必须派专人负责，严禁超载及私自加长车辆；
- 6、综合楼、电气楼安全防护围网脱落，且电气楼基坑马道处未进行临边防护；
- 7、现场钢筋直接放置于地面上，且下方无任何原材料、半成品防护措施；
- 8、现场临时用电线缆未按要求进行穿管埋地敷设，且钢筋加工棚内穿管线缆无弯头；
- 9、施工人员厨房液化气放置于室内，存在严重安全隐患；
- 10、现场拆卸模板、木方、管架乱堆乱放，且模板、木方堆放区域未配备灭火器；
- 11、进场施工人员未按要求进行体检，未签订劳务合同，且施工人员保险未购买；
- 12、进场施工机械未进行报验。

针对以上问题，要求贵单位 2 日内落实到位。

附图：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王海波


日 期：2019.08.21

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。


附:




土方未覆盖防尘网

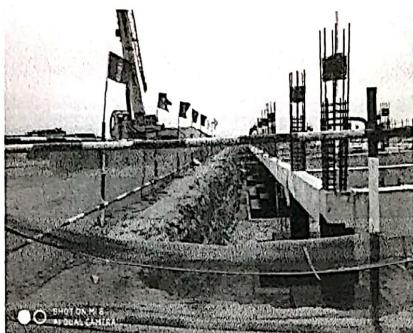


安全防护网脱落

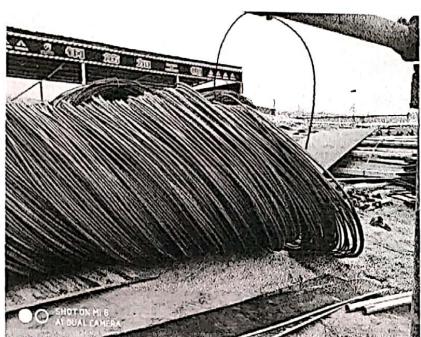


钢筋原材料直接放置于地面

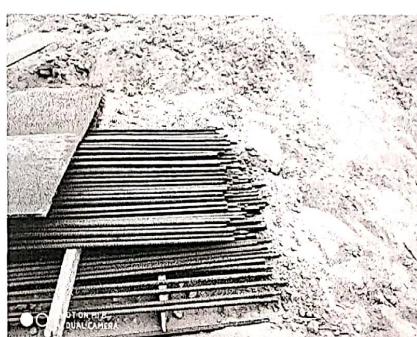


钢筋半成品直接放置于地面

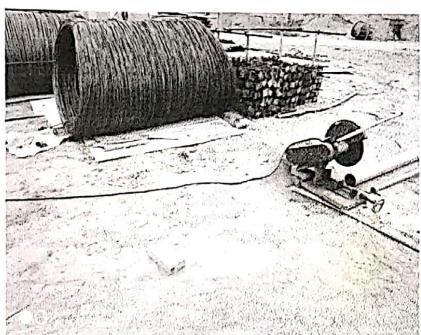


临时用电线缆未穿管埋地敷设

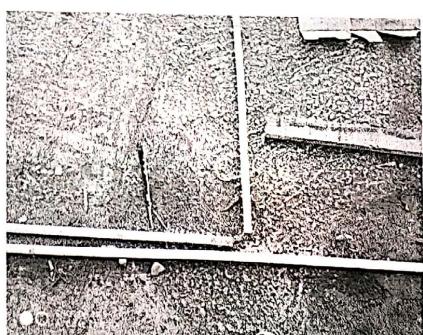

线缆弯头处未穿管

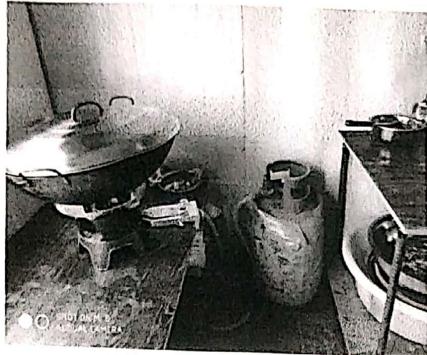

液化气罐置于室内

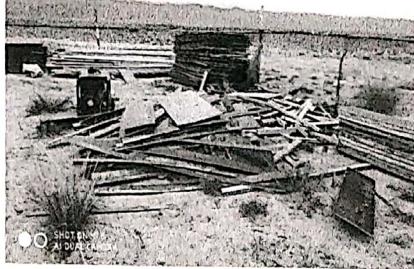

拆卸模板、木方散乱堆放



土方防尘网覆盖不全面
