

## 监 理 通 知 单

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-TZD-043

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于风机基础进度相关事宜

内容：

现场 16#、17#、18#、19#、20#风机基础二次灌浆施工已于 2019 年 11 月 14 日完成，但至今未提供二次灌浆试件抗压强度试验报告；现要求施工单位于 2019 年 12 月 21 日前出具二次灌浆试件抗压强度试验报告，以满足下一道工序施工需求。


针对以上问题，要求贵单位 3 日内整改完成并及时回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2019年12月11日

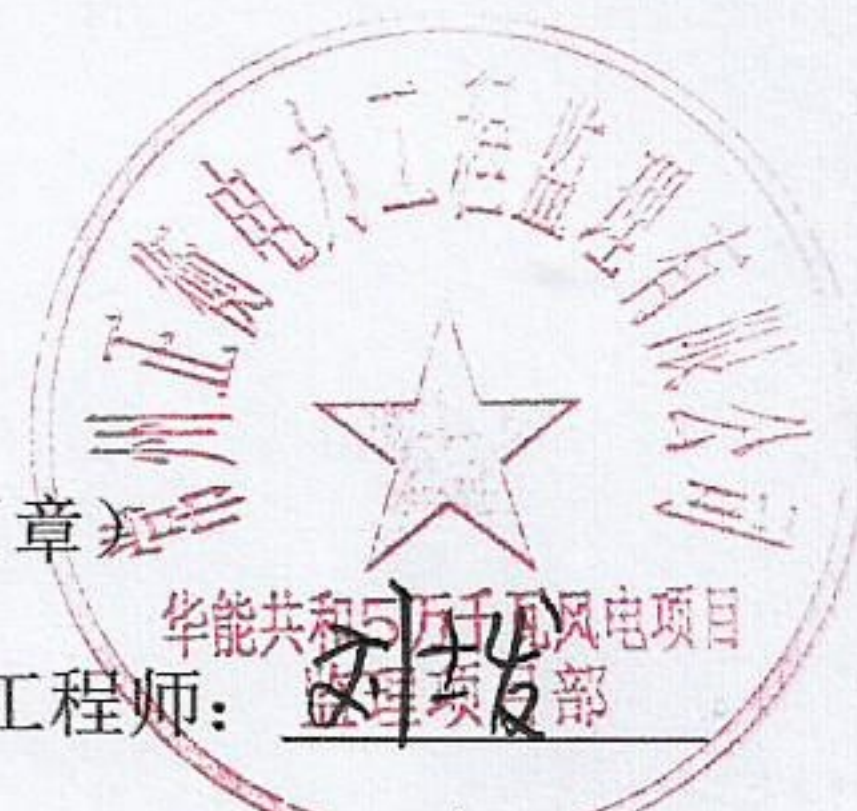

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
