

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM7-NJTB-009

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 钢结构施工项目部：

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 土建施工项目部：

事由：关于现阶段施工进度、质量、安全

由贵项目部承建的车棚钢结构安装工程：

1、贵项目部计划 10 月 21 日完成员工车棚钢构安装，但现场工作远远未满足计划要求。

2、部分完成的钢构 Z 型钢固定螺栓缺少，请贵项目尽快组织人员复查补充。

3、到货的镀锌刚系杆个别存在漏镀现象，因运输变形的刚系杆圆钢，修复后方可用于工程。

4、现场多次提醒钢构件搬运注意保护路面防止地面损伤，脚手架下加设可固定的滑轮，防止工人直接拖拉损伤路面，但现场仍发现地面机械损伤、工人直接拖拉脚手架现象。

5、登高安装人员未佩戴安全带或者佩戴不生根。

请钢结构安装项目部对滞后的施工进度制定详细的补救措施，否则我方会严格按照合同约定执行扣款统计工作，请你项目部引起高度重视。

由贵项目部承建的车棚基础工程：

1、成品车棚周边电缆沟抹灰所用砂浆无配合比且存在杂物，现场抹灰的表面存在起砂现象。

2、员工车棚组件拆箱后杂物未清理。

3、个别登高作业人员未佩戴厂区要求的安全带。

请土建施工项目部对完成的抹灰面采取补救措施。对后续多个工作面，合理安排人员加强现场管理强度。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年10月21日



注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

附件：

监理通知单问题清单

主 送	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目土建施工项目部 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢结构施工项目部	
工 程 名 称	南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目	
建设管理单位	南京梁泰光伏发电有限公司	业主项目经理：胡建 涂俊夫
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：徐耀生
施 工 单 位	先能电力工程有限公司(土建工程) 宁夏运鼎新能源有限公司(钢构安装工程)	土建项目经理：付孝海 安装项目经理：朱强
检 查 日 期	2019 年 10 月 21 日	
检 查 人	韩文庆、马少经	


一、 现场问题：

钢构安装工程

1. 部分完成的钢构 Z 型钢固定螺栓缺少，请贵项目尽快组织人员复查补充。



2. 到货的镀锌拉杆个别存在漏镀现象，因运输变形的刚系杆圆钢，修复后方可用于工程。

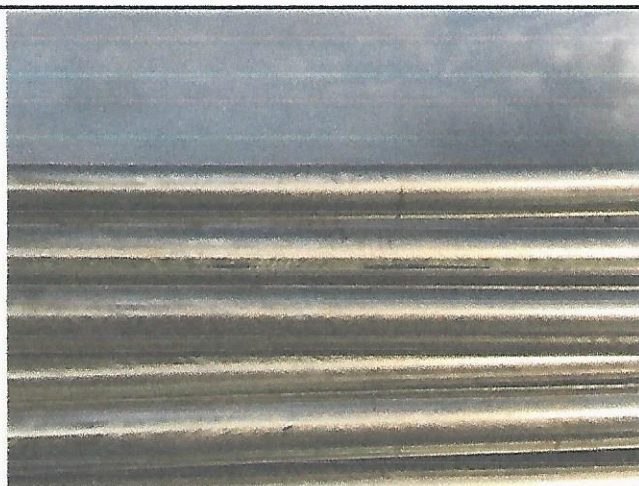

3、刚系杆搬运导致地面损伤。



土建工程

1、成品车棚周边电缆沟抹灰所用砂浆无配合比且存在杂物，现场抹灰的表面存在起砂现象。



2、员工车棚组件拆箱后杂物未清理。



南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目监理项目部

2019 年 10 月 21 日

