

监理通知单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-003

主送：湖南沪变电力技术有限公司

抄送：卫辉成泰能源开发有限公司



事由：关于施工安全和质量相关事宜

经我项目部监理人员巡视检查发现，对施工现场检查检查后发现工程现场存在以下问题：

1. 二期 2 号屋面部分桥架连接板生锈需更换。



2. 二期 2 号屋面厂房防水涂料太厚导致整排夹具无法扣紧。

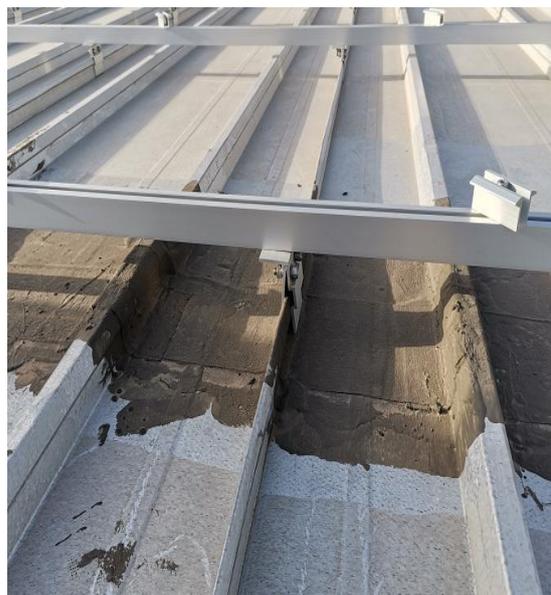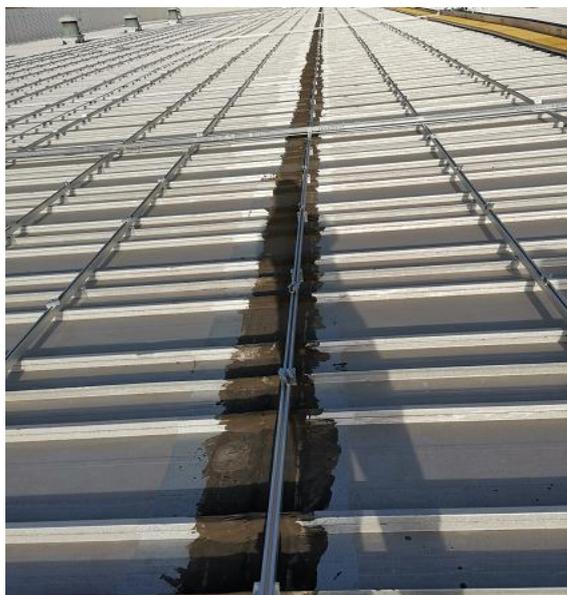

3. 二期 2 号屋面部分桥架连接板螺栓生锈。



4. 二期 2 号屋面下墙桥架盖板未固定紧需重新固定。



5. 二期 2 号屋面下墙桥架竖向支撑与桥架连接，未起到支撑作用



6. 二期 2 号屋面桥架内高压电缆与通信电缆未分开敷设




7. 二期 2 号屋面检修通道板之间连接处未按设计进行底部加固



8. 二期 2 号屋面爬梯下屋面处梯子缺少横向支撑需进行加固



9. 厂房爬梯护笼过短，需按国标进行加固。（此项若业主不同意改，需提供书面证明或类似沟通记录）

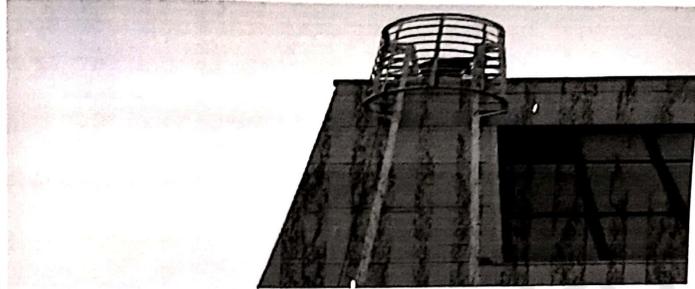

回复：限你方三口内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2023年5月11日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
