

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-006

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于现场到货电缆桥架材料质量问题事宜。

内容:

我监理部汇同建设单位, 对贵单位采购电缆桥架材料进行到货镀锌层厚度测量, 实测部分桥架镀锌层局部厚度低于设计图纸要求, 抽查 10 组测试数值: 51.0 μm 、49.4 μm 、51.9 μm 、51.7 μm 、77.3 μm 、55.0 μm 、58.1 μm 、49.4 μm 、75.5 μm 、66.8 μm (详见下页附图), 设计要求镀锌层厚度不得小于 65 μm 。

现要求贵单位对不合格桥架材料进行整改, 整改完成后报监理及建设单位复查, 合格后再进行使用。

特此通知

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 08 月 27 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

下页附图


附图一：



附图二：



附图三：

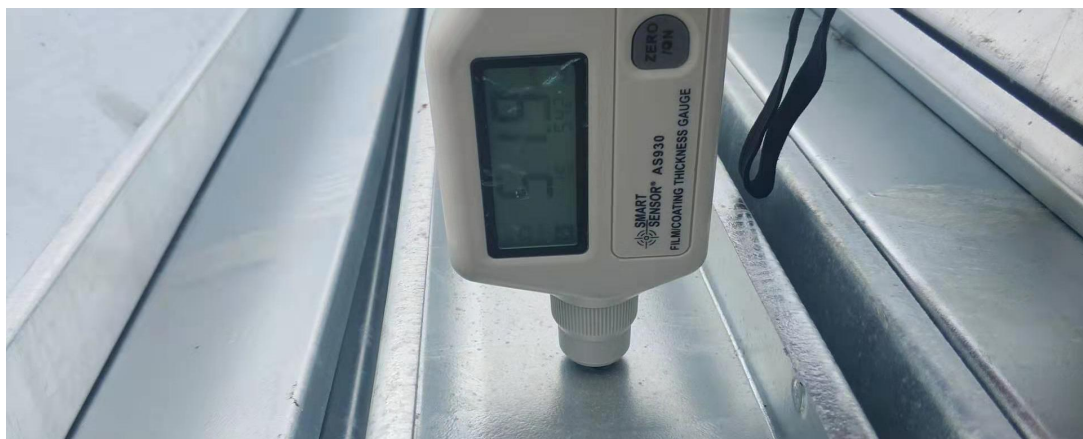

附图四：

