

监 理 通 知 单

工程名称:福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZD-007

致: 中磐建设集团有限公司

事由: 关于现场施工质量问题事宜。

内容: 监理部对现场施工质量进行巡视检查发现存在以下质量问题:

1、屋面接地环网施工, 接地扁钢焊接存在焊缝不饱满、夹渣、气孔、咬边个别搭接面长度不符合要求质量问题, 焊接后作业点药渣未清理干净。

2、配电室并网柜端电缆终端头制作工艺较差, 存在绝缘热缩套管未缩紧、烧伤、电缆绝缘层划伤质量问题。

3、部分部位电缆敷杂乱不整齐, 交流、直流、通讯电缆交叉, 交流电缆未达到横平竖直要求, 未整改完成前不得私自封盖桥架盖板。

以上问题现要求贵单位限期三日内整改完成, 整改完成后报监理部复查, 特此通知。(问题详见下页附图)

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

日 期: 2019 年 08 月 30 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

下页附图

附图一： 搭接面焊接长度未达到扁钢宽度两倍以上



附图二：焊缝不饱满



附图四：咬边




焊渣未清理



附图五：焊缝不饱满、刷漆不到位



附图六：电缆敷设杂乱

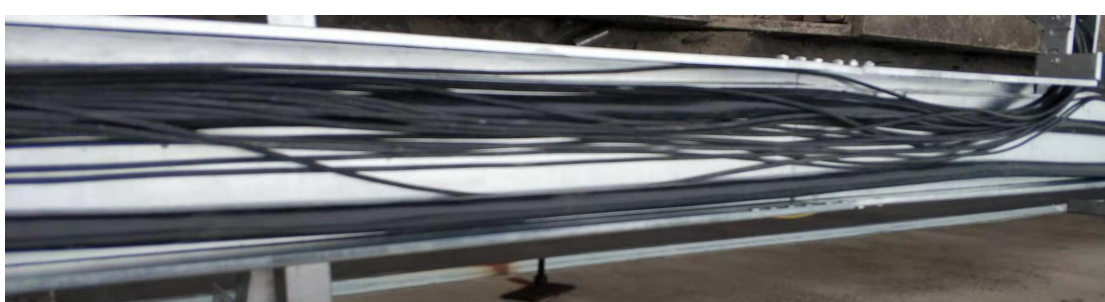


附图七：电缆敷设杂乱



附图八：电缆头热缩管烧伤、端口有缝隙



附图九：热缩管未包到位、绝缘层刀口划伤

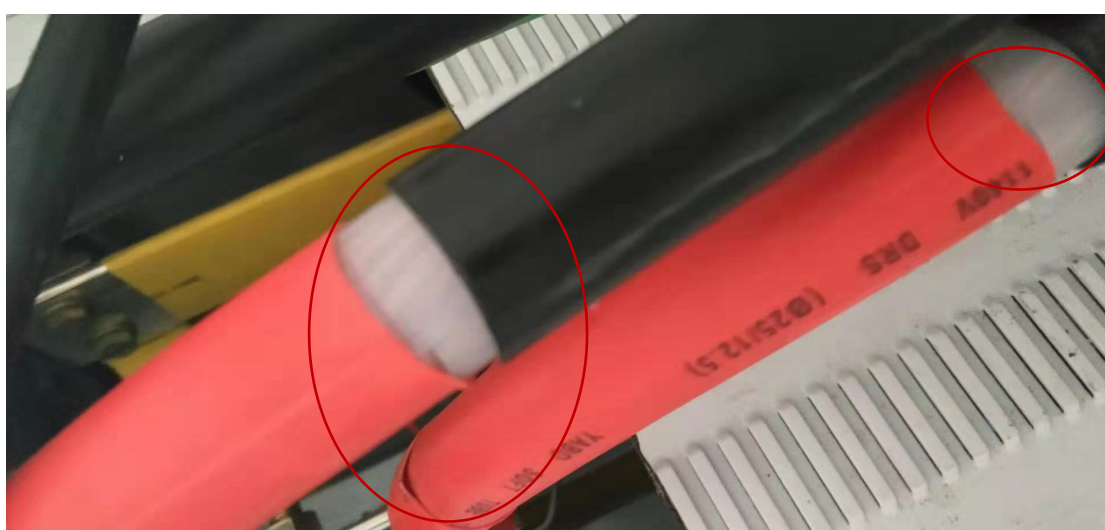

附图十：进配电室电缆杂乱

