



监理通知单

工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JMWH-TZ-001

致：湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：安全文明施工、现场安全防护事宜


内容：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目建设已启动，施工已开始。项目的资料整理和要求，监理项目部建议如下，对现场安全我单位做出以下要求：

1. 屋面临边围网高度未达到 1.2m 要求。
2. 临边安全围网支持点过少，需要多增加支承点，临时上人梯围网已腐蚀需要更换。
3. 施工现场未见警示牌警示标语，未见《五图一牌》。
4. 现场施工人员安全防护措施必须配备到位，安全帽必须正确佩戴，屋面严禁出现吸烟情况。
5. 钢结构加固，严禁出现烟火，动火作业先报备，且现场防火措施必须配备到位，同时加强现场安全巡视检查，对存在的问题及时整改完善。
6. 针对夏季高温施工，合理安排施工时间，避开高温时间段，防中暑药品配备到位施工现场，严禁出现施工人员赤膊、穿拖鞋和酒后上岗，安全员和各班组负责人加强对佩戴安全防护用品使用的检查，为防止高空坠落事故，对身体素质差、不适应高温作业的人员、年纪过大的人员及时调换岗位或调离岗位，注意检查用电设施、电线、机械等是否存在漏电、老化等情况。
7. 所有进场施工人员必须进行三级安全教育，每日、周进行施工人员现场安全、施工技术交底，并形成纸质性文件留存。


对近期各省市建筑生产出现的安全事故，我部将按国家 4.1 下发的《生产安全事故应急条例》中内容，要求施工单位必须成立安全应急救援机制，且安全员必须到岗，对涉及吊装、高空、动火等工序开展，必须提前上报项目部，如未按照要求执行，将进行通知单、处罚、停工、监理报告等形式上报至各项目单位公司，请严格执行，再次强调安全第一，对现场出现的问题及时上报监理部及建设部，现要求施工单位管理人员对现场施工人员进行安全技术交底并做好记录。对现场安全围网高度达不到要求进行整改完善同时增加支撑点，各工序完成后需进行报验，待我部及建设单位验收后，方可进行下道工序施工，否则我部将对该工序不予以验收及签字盖章，限本周完成上述整改要求。



扫描全能王 创建

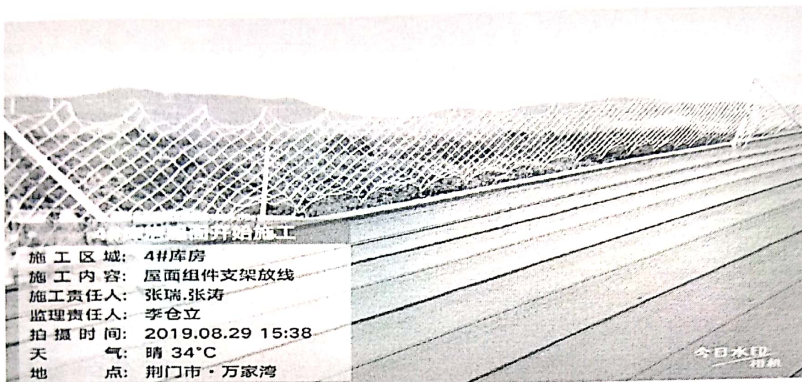

施工区域: 4#库房
施工内容: 屋面组件支架放线
施工责任人: 张瑞,张涛
监理责任人: 李仓立
拍摄时间: 2019.08.29 15:38
天气: 晴 34℃
地点: 荆门市·万家湾

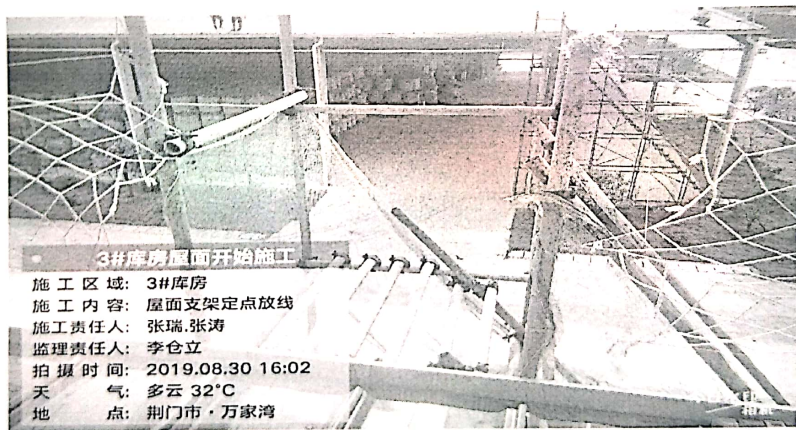

3#库房屋面开始施工
施工区域: 3#库房
施工内容: 屋面支架定点放线
施工责任人: 张瑞,张涛
监理责任人: 李仓立
拍摄时间: 2019.08.30 16:02
天气: 多云 32℃
地点: 荆门市·万家湾



监理项目部(章):

总/监理工程师: 王道春

日

期: 2019年8月29日

注: 本表一式3份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建
