

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-008

主送：安徽天太太阳能光伏工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

主题：关于乙供物资质量事宜

内容：

- 1、贵单位乙供到货接地圆钢，经我监理单位抽查测量镀锌层厚度数值为：27.2 μm 、34.0 μm 、27.7 μm 、22.9 μm 、25.7 μm 、17.5 μm 、21.1 μm 、21.4 μm 、31.3 μm ，不符合设计要求，图纸设计要求为接地圆钢、垂直接地极均进行热镀锌处理，平均厚度不小于 80 μm 。
- 2、乙供桥架支架角钢，经我监理单位抽查测量镀锌层厚度数值为：30.2 μm 、19.3 μm 、9.2 μm 、47.2 μm 、37.3 μm ，不符合设计要求。
- 3、其它未尽事宜请自查自纠。

贵单位所到场乙供材料，均未进行材料报审，报监理部审核，私自使用影响工程质量，现要求对到场不合格材料清退出场，不得私自于本工程，对已施工的返工整改，待返场后须上报监理审核，提供厂商资质、质量证明文件，确保工程质量，要求将整改结果于 2019 年 11 月 30 日前回复本项目监理部。（详见第二页附图）

项目监理机构（章）：


总/专业监理工程师：

日

期：2019年11月26日



附图：圆钢镀锌层厚度不符合要求图片

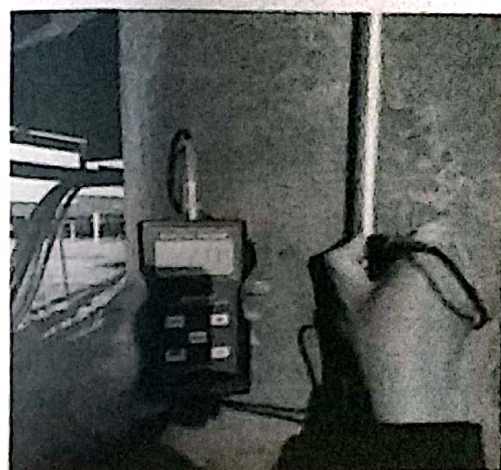

本表一式 三 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 二 份。
