

## 监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-010

主送：天津滨唐建筑有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司


主题：关于光伏区围栏质量问题事宜

内容：

- 1、我监理部人员对光伏区围栏施工进行巡视检查发现，围栏施工存在立柱安装参差不齐，不顺直，网片安装未拉紧、不平整，有明显翘曲和凹凸现象，观感较差。
- 2、贵司开工前未向建设单位、监理项目部报审开工资料，到货乙供围栏材料未进行材料报审，私自施工，不符合工程管理规定，影响工程质量。
- 3、浇筑混凝土冬季施工须进行保温措施。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求贵单位报审围栏工程开工资料、材料报审资料（提供厂商资质、质量证明文件）报监理部审核，待审核合格后再进行施工，已施工质量不合格的返工整改，确保工程质量，将整改结果于 2019 年 11 月 30 日前回复本项目监理部。

围网问题照片

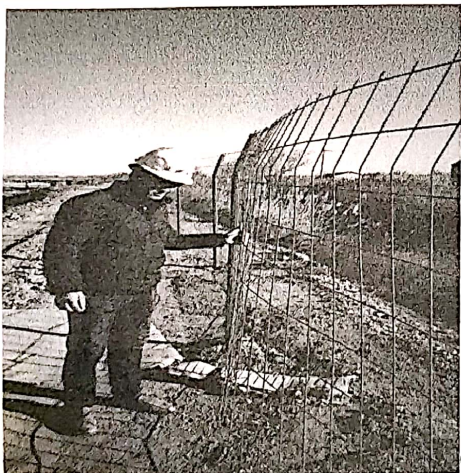

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019年11月27日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
