

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-012

主送：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司



主题：关于边锚管桩顶板、耳板施工质量问题事宜

内容：

- 1、我监理部人员对项目现场巡视检查发现，你单位边锚桩顶板、耳板焊接施工存在：管桩定位放线不准沉桩后偏差，导致耳板焊接偏差太大，焊接面无法全部焊接到顶板上，受力不均匀，影响工程质量；你单位私自加设钢板垫片焊接施工，现要求你单位对此问题跟设计技术部门沟通出具可行性整改方案后再进行施工。
- 2、你单位管桩、构配件材料到货、放样施工、打桩施工等工序均为进行材料报验、工序报验。
- 3、其它未尽事宜自查自纠。

以上问题及时整改，施工过程中相关资料及时报验做到与工程实体同步，确保工程质量，将结果于 2019 年 12 月 05 日前回复本项目监理部。

质量问题照片

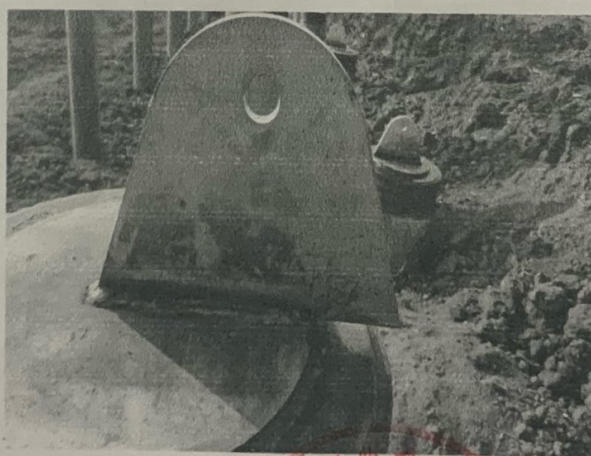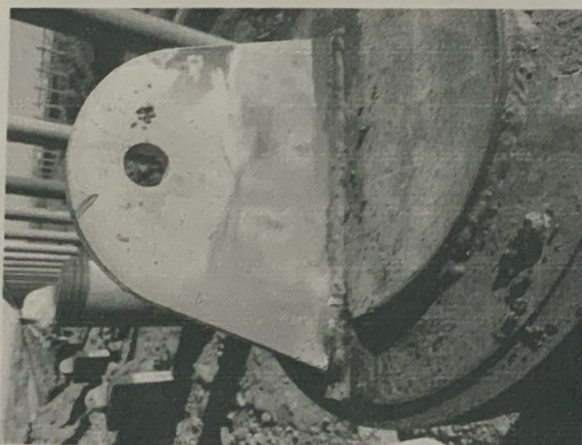

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019年12月02日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。
