

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目
编号：TJYJP-CZZH-TZD-020

主送：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：关于逆变器安装及电缆敷设质量问题事宜

内容：我项目监理机构对你单位施工检查发现存在以下问题

- 1、逆变器安装支架紧固件缺少螺母、弹垫。
- 2、过路电缆敷设，电缆套管未做防火封堵，桥架入土回填前需盖板。
- 3、桩基未做试验依然在进行拉钢索下道工序施工，不符合工序要求存在质量隐患。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

现要求贵单位对以上问题尽快整改，严格按照设计要求施工，确保工程质量，
将整改结果于 2020 年 01 月 06 日前回复本项目建设单位及监理部。

附件：问题照片。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

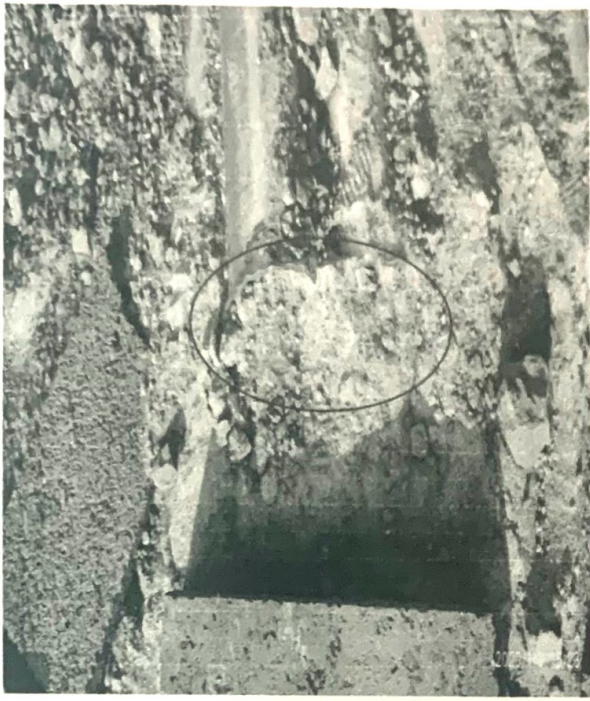
日

期：2020年01月03日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

问题照片:

电缆套管质量问题照片	电缆敷设质量问题照片
	
逆变器安装质量问题照片	
