

监理工程师通知单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-TZD-033

主送：羲和电力有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

内容：关于现场质量相关事宜

我监理部人员对你单位光伏区施工现场巡视检查发现存在以下问题：

- 1、组件安装施工，在承重索上搭设脚手架，造成已安装完成组件组串承重索外皮划伤严重，影响工程质量，电站寿命。要求上报组件安装专项施工方案，施工方法得当、符合工艺要求，对损伤承重索进行更换。
- 2、承重索锁头紧固件，表面已出现锈蚀现象，影响工程质量。要求对锈蚀配件材料进行更换。
- 3、组件随意堆靠在承重索上，易造成组件隐裂，影响质量。
- 4、其它未尽事宜请自查自纠。

以上问题要求严格按照设计及相关规范要求整改落实完成，如出现质量问题由你单位羲和电力有限公司承担一切后果，望重视，限你单位于 2020 年 05 月 06 日前整改回复本项目建设单位及监理部。

附：问题图片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

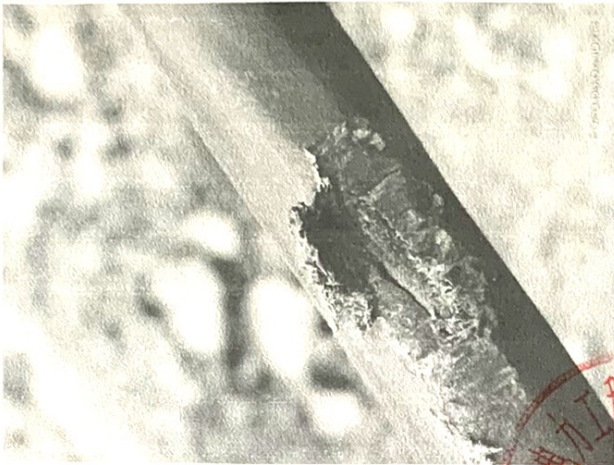
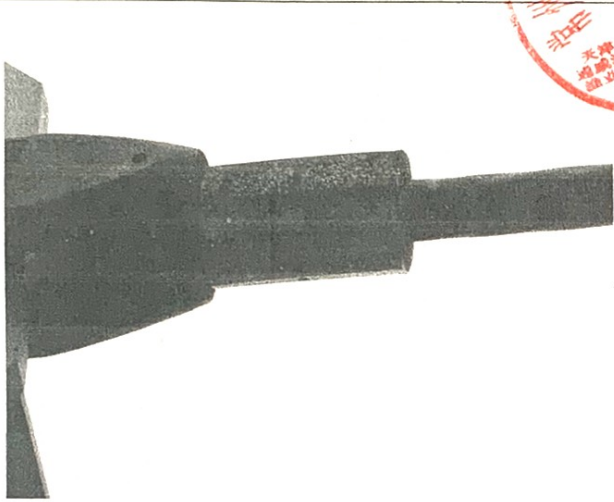
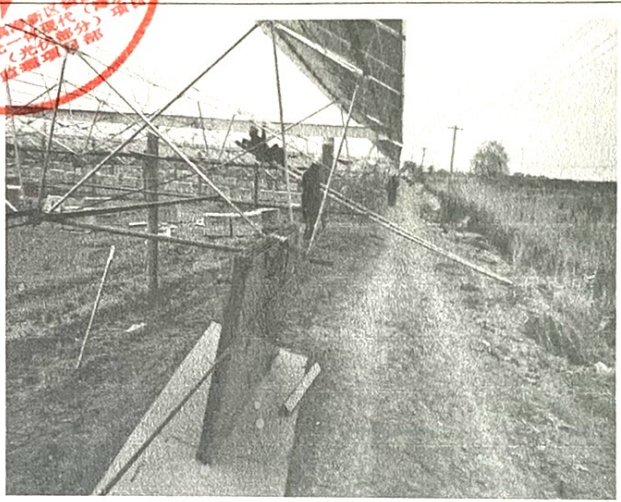
日

期：2020年05月04日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

附件：问题照片

	
承重索损伤	承重索损伤
	
承重索锁头紧固件生锈	组件堆放不符合要求
