

监理工程师通知单

工程名称：崇礼区 9 个村级扶贫电站项目（六标段）

编号：ZHJL-TZD-001

致：陕西众森工程有限责任公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（六标段）项目部

主题：关于现场施工检查，存在引孔高差及黄土板梁村引孔积水相关事宜

内容：

2019 年 09 月 15 日，经业主、监理在六标段下窑子村及黄土板梁村巡视发现，现场施工存在以下事宜：


1、下窑子村预埋件前后引孔未按设计要求，致使放置预埋件后前后高差过大造成后期施工高低偏差；

2、引孔浇筑预埋件前必须经我监理人员检测合格后方可进行下道工序；

3、黄土板梁村部分引孔内存在积水现象，要求浇筑前将水清理干净；

针对以上问题，要求施工单位立即对不符合要求的施工点进行整改，整改完成后报监理复验合格后，再进行下一道工序；陕西众森现场管理人员，必须严格按施工方案制定的措施进行现场作业监督，同时对施工人员做好安全技术交底。

附照片

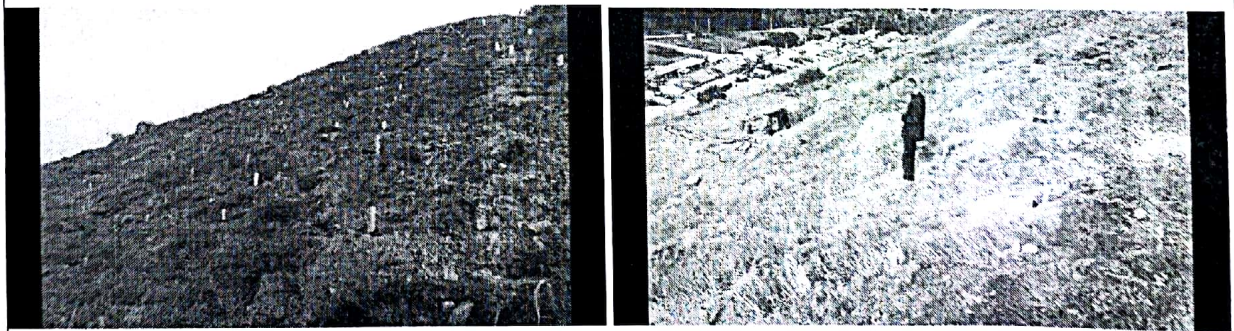

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师： 张良全

日期： 2019.9.15

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建
