

监理通知单

工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号: XDXGFFPXM-2-851-5-4-2


致: 云南强世建设工程有限公司、云南蓝创机电安装工程有限公司 施工项目部

主题: 关于施工现场组件安装相关事宜

内容:

1、2019年11月06日我方对施工现场组件安装进行检查,发现存在以下问题:

- ①、地面支架间距尺寸不合理导致组件固定不牢固及组件2公分伸缩缝无法保证。
- ②、支架方阵整体对角线未测量,方阵成平行四边形影响电站整体质量。
- ③、屋面组件边压块压接不实,无法与支架无缝压接。
- ④、屋面檩条悬空尺寸过长,易导致组件悬空并导致组件损坏。

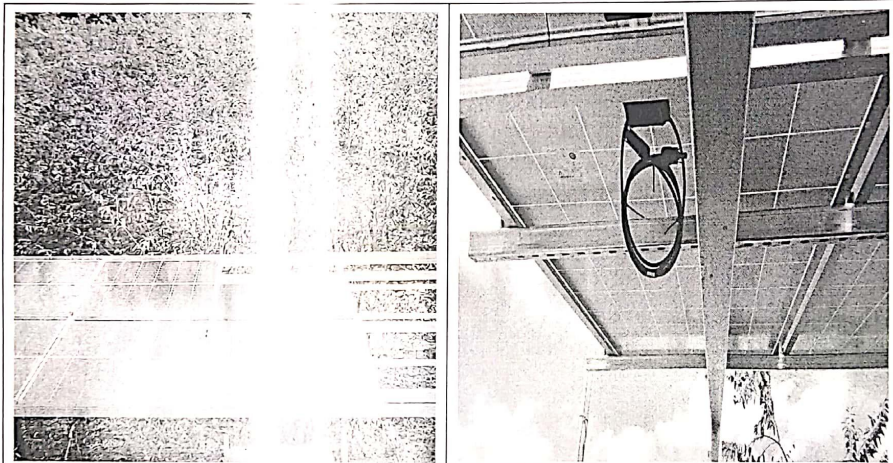

为保证工程质量,要求贵单位出具整改方案并对所存在问题对其他电站进行自检,地面支架安装间距仔细计算,严格按照图纸要求施工。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

苏航

2019.11.06

殷光祥 段廷祥

注: 本表一式 3 份, 由监理单位 3 份, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理单位存 1 份
