

监 理 通 知 单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-005

致: 安徽慧天新能源技术有限公司施工项目部


抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司(合肥) 项目部

主题: 关于施工进度情况检查

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目施工进度进行检查, 发现存在以下问题:

多日来安徽慧天新能源技术有限公司施工及管理人员平均每日不超过 8 人, 人员数量过少, 施工进度缓慢, 造成施工进度滞后, 现要求慧天新能源技术有限公司项目部尽快增加施工人员, 限期 3 天整改。按班组排好施工进度计划, 抓紧施工, 让 2#、4#、5#屋面早日完成电缆敷设尽早送电。

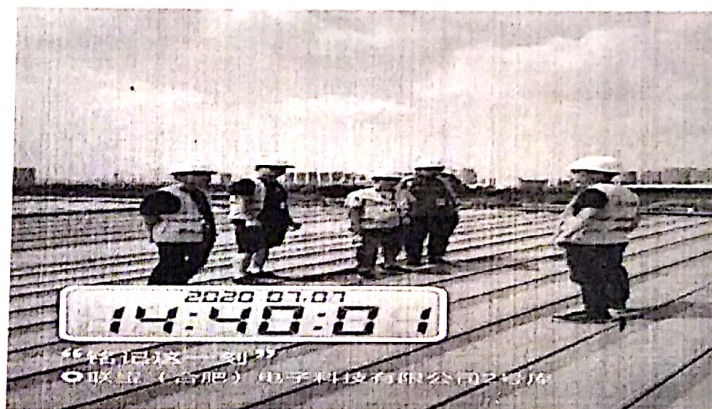

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 房玉华

日期: 2020.7.8

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建
