

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目



编号：ZHJL-WZLT-TZD-010

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：关于升压站配电装置楼脚手架安全网的事宜

内容：

升压站配电装置楼脚手架已搭设完毕，进行外墙龙骨安装。我监理项目部现场检查发现未安装安全网，存在严重安全隐患。要求你部停止作业，必须立即安装安全网，高空作业人员必须做好安全防护措施，佩带安全带、安全帽，否则不允许施工作业并进行经济考核。

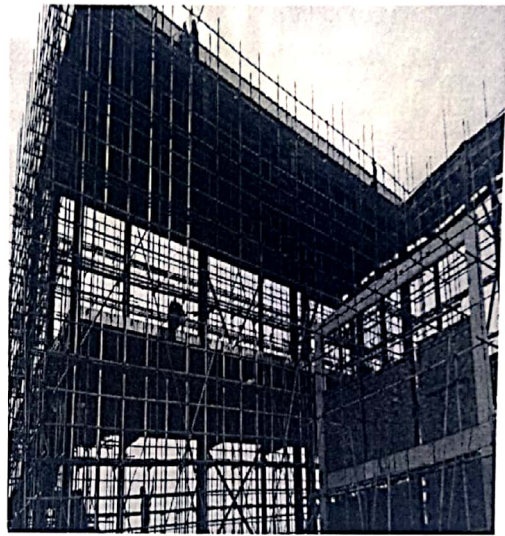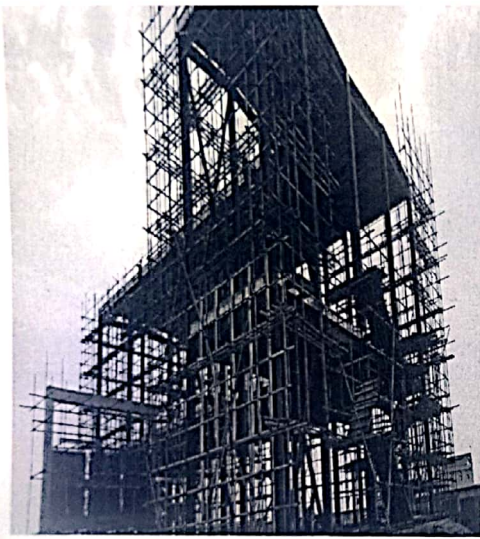

安装完成后报监理项目部检查。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年4月14日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建
