

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目


编号：ZHJL-WZLT-TZD-023

致：上海电力建设有限责任公司 施工项目部

事由：关于高压电缆敷设质量的问题

内容：

监理项目部现场巡视检查发现光伏区高压电缆敷设深度不符合要求（有的地方距地面只有 300mm 左右（设计要求单根电缆距离地面 $\geq 700\text{mm}$ ，两根以上电缆距离地面 $\geq 1000\text{mm}$ 。），不能很好的保护电缆，要求必须立即整改。整改完成必须通知业主、监理检查合格后方可进行下道工序施工，否则，造成的后果由你公司承担。

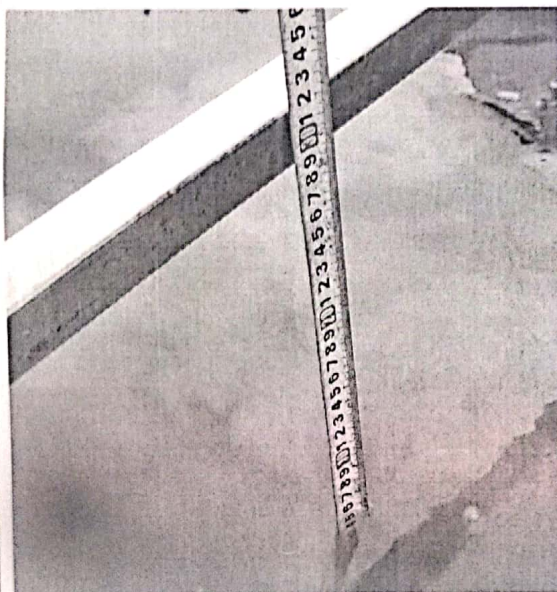

限 3 日内回复

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 06 月 06 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建
