

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-054


致：中易建设有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区主网接地沟未报验回填的事宜

内容：

监理项目部现场巡视检查时发现，你单位施工的 27 号地光伏区域的环网接地回填前未报监理及业主验收私自回填，水平接地体搭接处只单面焊接，焊接处未做防腐处理。24 号地用线卡连接及单面焊，现场多次督促仍未整改，存在着严重的质量隐患。

现要求必须立即整改，要求回填处挖开检查。整改完成后，监理项目部检查，否则，造成的后果由你公司承担。

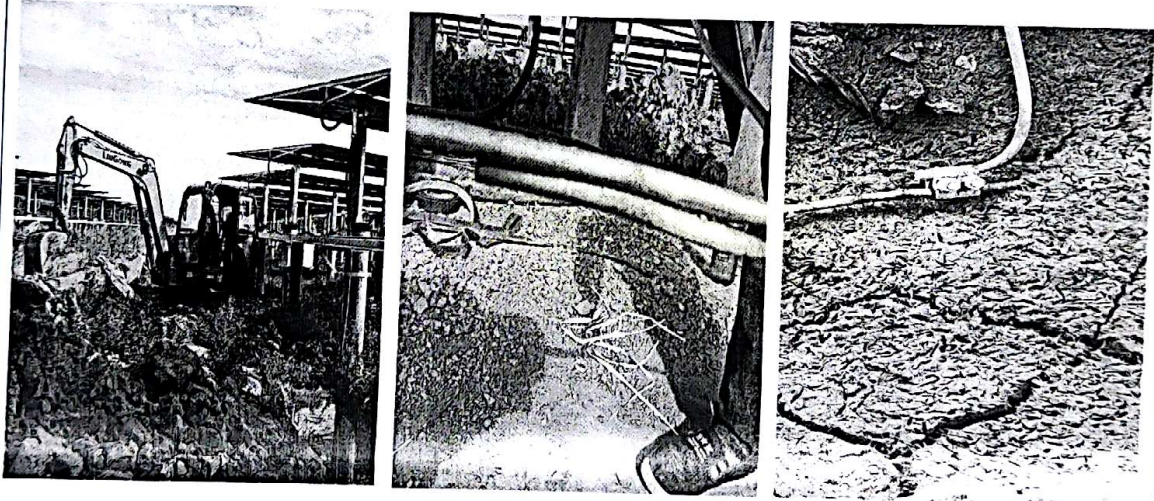

限 3 日内回复

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 10 月 25 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
