

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-058

致：上海电力建设有限责任公司 施工项目部


事由：关于环网接地焊接安装的事宜

内容：

光伏区 28 号地未经监理项目部、业主项目部检查验收，擅自进行回填隐蔽。检查发现桩头接地引下线与水平接地体未连接，未安装垂直接地体。

要求：回填部分全部挖开，按设计要求施工安装，经验收合格后方可回填隐蔽。

所有隐蔽工程必须报监理项目部、业主项目部检查验收，否则，擅自隐蔽部分必须挖开检查。

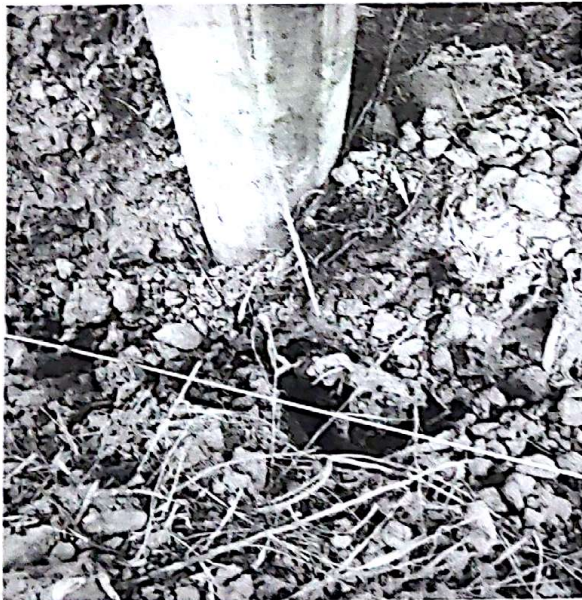

项目监理单位（章）

总/专业监理工程师：

葛文琦

日期：2021 年 1 月 11 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。
