

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

监 理 周 报


第 三 期

(2019 年 11 月 25 日-2019 年 12 月 2 日)




工程名称	昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站	建设单位	昆明市人民政府扶贫开发办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	一标段：四川东旭电力工程有限公司 负责人：褚智军 二标段：南京中核能源工程有限公司 负责人：李金昌 三标段：鼎晟光伏能源有限公司 刘乃凡 四标段：云南朔铭电力工程有限公司 赵家鹏 五标段：湖南恒宇电力建设有限公司 胡志军		
本周施工内容及进度	1、施工各标段基础施工基本完成，开始支架安装。 2、一标段电站基础施工已全部完成，支架安装完成 90%，二标段电站基础施工完成 80%，支架安装完成，组件开始安装完成 35%，三标段基础完成 80%，四标段电站基础施工完成 80%，支架安装 40%，五标段电站基础施工完成，支架安装完成 80%，组件安装完成 30%。 3、支架及零部件进场检查；组件到场进行开箱检查，逆变器、并网柜，电缆等设备到场。		
下周计划	1、三标段要完成基础施工，支架安装 70% 2、支架安装完成；安装组件 60%。 3、各标段施工慢的加派人手保证施工进度。 4、三级安全教育要做好，人员安全工器具要配备齐全。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育。 2、进场工人佩戴好安全帽，并配有其它安全措施。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、符合施工要求及规范，现场施工质量可控		

设备材料进场情况	1、砂、石、水泥进场。 2、支架、组件进场。
人员机械情况	人员:75 人 挖机 1 台、发电机 5 台,。

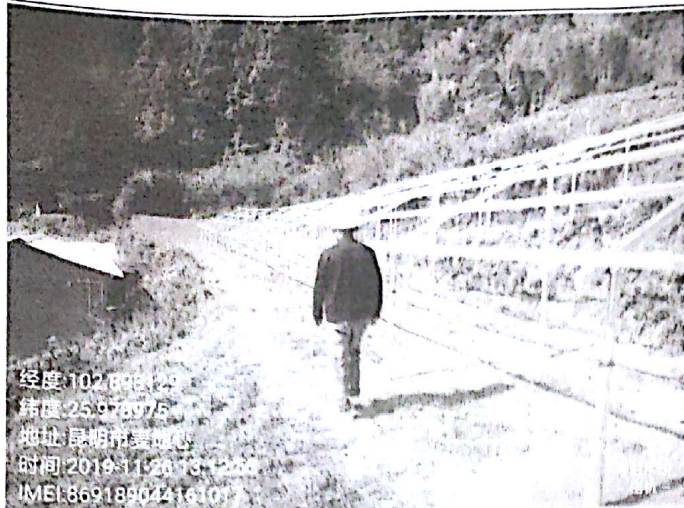


巡视四标段支架安装施工

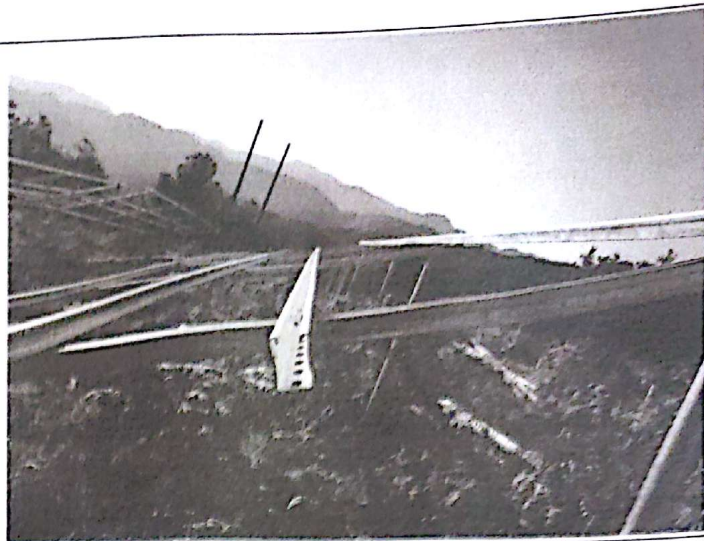

二标段支架施工



三标段基础施工

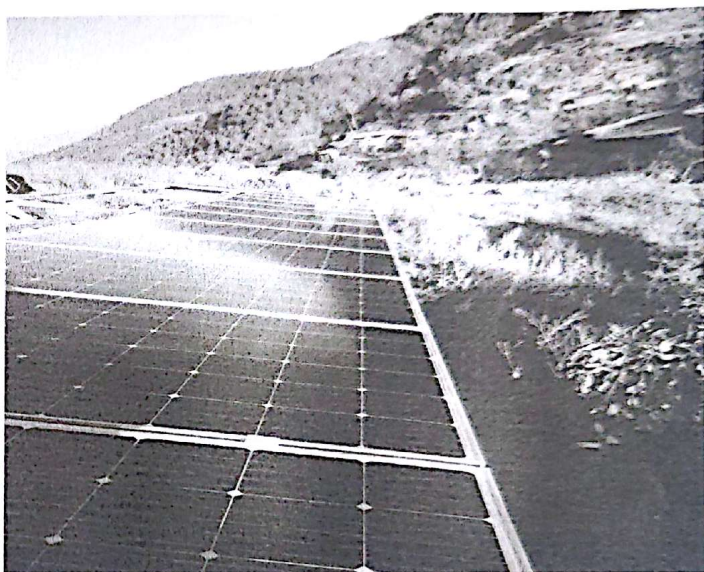

二标段部分组件安装
