

监理通知单

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JXM7-ZHJL--002

主送: 天津电建新能源有限公司

抄送: 钦州通威惠金新能源有限公司

主题: 关于项目外线区未按图纸要求施工相关事宜

经业主及监理部现场巡视发现, 5#塔基基础开挖及支模未按图纸要求施工, 塔基基础深度及基础平台不满足设计要求(附图如下), 根据此情况, 要求你单位对5#塔基进行整改, 严格按照图纸施工, 整改完成后通知我方监理及业主部相关负责人进行现场验收, 验收合格后方可进行下道工序; 如果其它已施工平台(包括但不限于1#、2#、6#、7#)因未按照图纸要求施工, 后期所发生的一切问题由你司自行承担。望贵单位重视!

如对本监理通知单内容有异议, 请在48小时内向监理提出书面报告, 请于2019年12月6日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2019年



本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。


塔基基础平台第二阶层图纸设计要求为 3200mm 现场实测为 1880mm 左右



塔基基础平台深度图纸设计要求为 3400mm 现场实测为 2700mm 左右



图纸设计要求

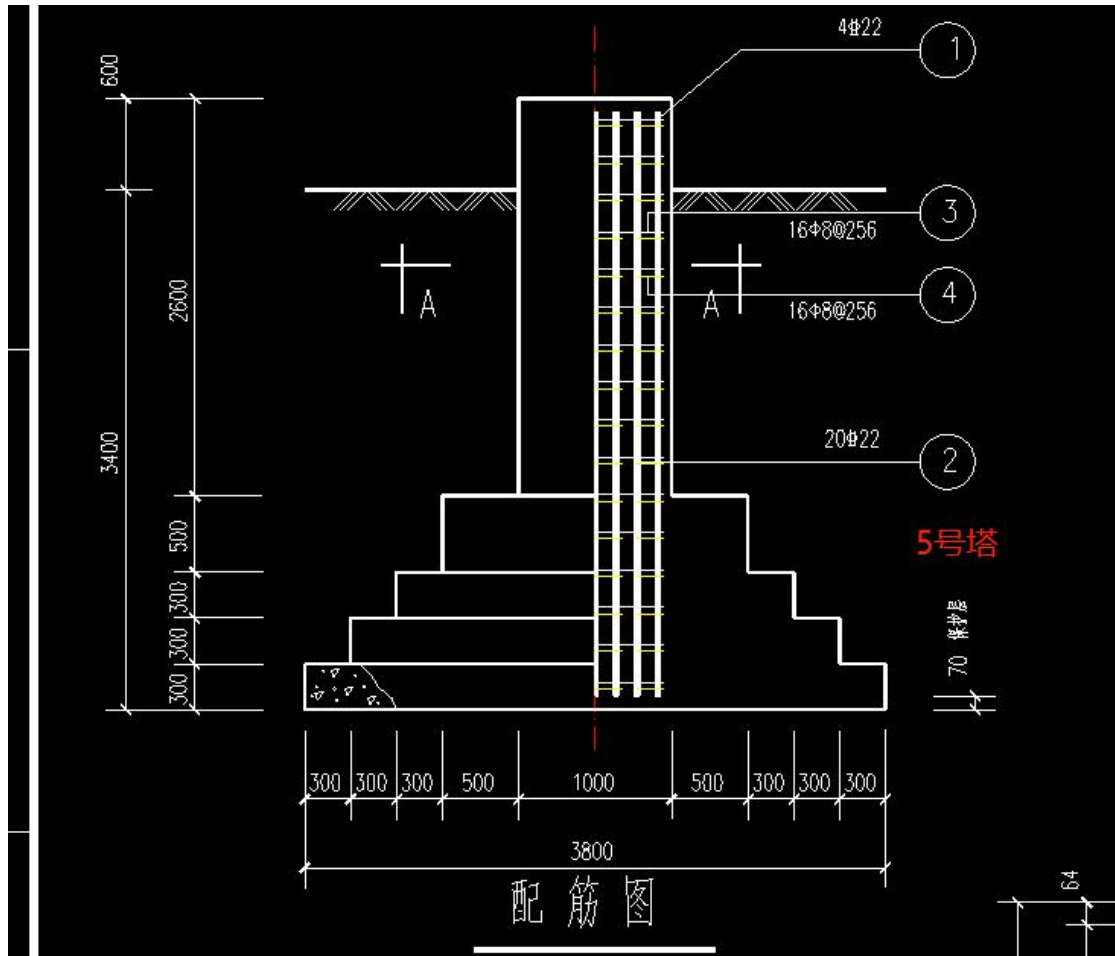

k 表 B.0.9 监理通知回复单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）项目架空集电线路工程

编号：002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 JXM7-ZHJL-002 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请给予复查。

附件：无

整改如下：

5#塔基础深度及基础平台已经按设计图的尺寸要求进行整改施工，现申请监理给予复查验收工作。

施工项目部经理（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：

2019年12月17日



复查意见：

5#基础已按要求整改完毕（图纸要求），但是，
支模在淤泥层。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

日期：2019.12.18

