

监理通知单

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: JXM7-ZHJL--004

主送: 四川宝能电力工程设计有限公司

抄送: 钦州通威惠金新能源有限公司

主题: 关于箱变基础浇筑质量相关事宜

经监理部现场巡视发现, 27#箱变基础浇筑不达标(基础悬挑梁变形并且混凝土养护未按照混凝土养护规范执行。27#箱变基础于 2019 年 12 月 7 日浇筑, 2019 年 12 月 11 日底模已拆模), 不符合(《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011)相关规范条款, 存在质量隐患。现要求你单位对 27#箱变基础立即整改, 并对 27#箱变基础进行回弹测试, 确认该基础是否达到拆模要求。

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2019 年 12 月 14 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2019年12月12日



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

箱变基础悬挑梁变形

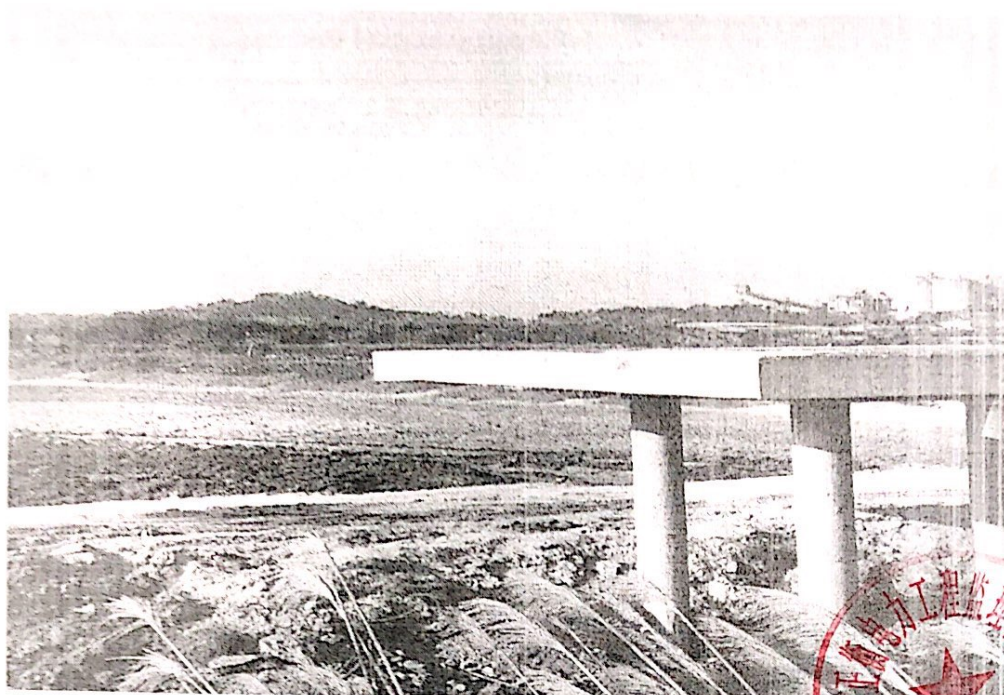


表 B.0.9 监理通知回复单

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）

编号：SCBN-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-ZHJL-004 监理通知单后，已按要求完成相关工作，请给予复查。

附件：无

按照监理要求，已采购混凝土回弹仪，27#基础进行复检强度满足要求，针对后续基础拆模前，检测强度达到要求后方可拆模。

施工项目（章）：

项目经理： 王旭 (印)

日期： 2019.12.18




复查意见：

经复查，现场回弹情况属实

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

日期： 2019.12.19



扫描全能王 创建
