

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-HNGF-TZD-002

致：湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：


2019 年 12 月 26 日我监理人员巡查检查时发现现场施工中存在问题：

1、开关站一次舱、二次仓等基础施工中存在着未按图纸要求施工的问题，图纸要求相应部位要有 800mm 宽的悬挑板，而现在施工中未设置；


2、光伏区灌注桩施工中个别处存在振捣不到位、跑模、桩预埋管偏移较大的问题，另外因下雨，钻好的桩孔中积水、污泥也要清理干净才能进行浇筑。

针对以上问题，现要求相关施工单位立即整改，严格按图纸要求施工，整改完成自检合格后报监理项目部复查，合格后方可进入下道工序，否则将给予严厉处罚，后附图。

以上问题三日内回复。

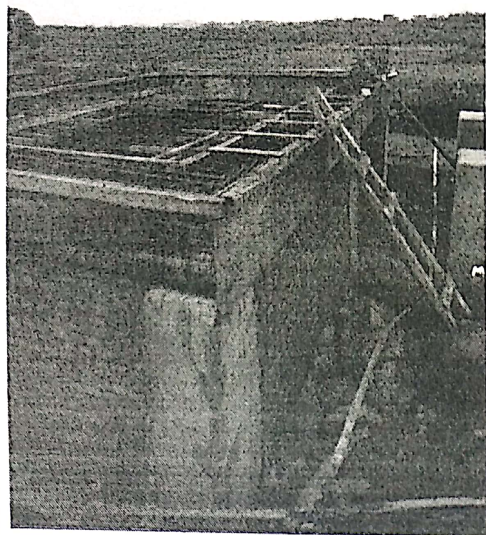

缺少悬挑板

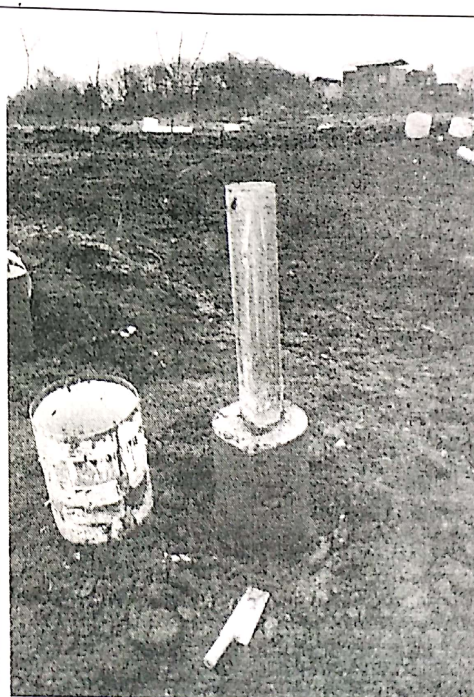

蜂窝情况
