

监 理 通 知 单

工程名称: 肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目 编号: JXM7-FD-02

致: 肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目 施工项目部:

事由: 关于现阶段施工遗留的质量问题

由贵项目部承建的肥东普枫物流园屋顶光伏发电区域, 经我监理方检查发现如下问题:

- 1、组件下电缆及 MC4 接头存在拖地现象。
- 2、组件间接地线未按照设计及规范要求设置垫片。
- 3、阵列间镀锌扁钢连接, 搭接长度及固定方式不符合规范要求。
- 4、运维通道局部固定不牢靠, 个别部位需增加托架。
- 5、接地扁钢个别未防腐, 扁钢需离开彩钢屋面。
- 6、视频监控立柱未接地, 电缆桥架内视频监控线缆接头不牢靠。
- 7、个别阵列边侧夹具间距超过 500mm 需增加夹具。
- 8、个别组件跨接接地线断开失效。
- 9、垂直桥架未按照规范要求间隔接地。
- 10、桥架内个别交流电缆有划伤需修复处理。

针对以上问题请贵项目部收到通知后, 认真对待举一反三全面排查所有发电区域, 待整改完毕应再次执行“三检”制度方可报监理验收, 限期 7 日内整改完毕;

附件: 监理通知单问题清单

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2020 年 9 月 1 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附件：


监理通知单问题清单

工程名称

肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目

一、现场问题：

1、组件下电缆及 MC4 接头存在拖地现象。

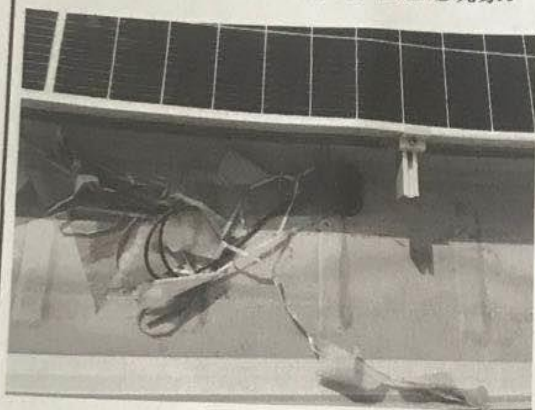


2、组件接地线未安装垫片；

3、镀锌扁钢搭接长度及固定方式不符合规范要求




4、运维通道固定不牢靠。

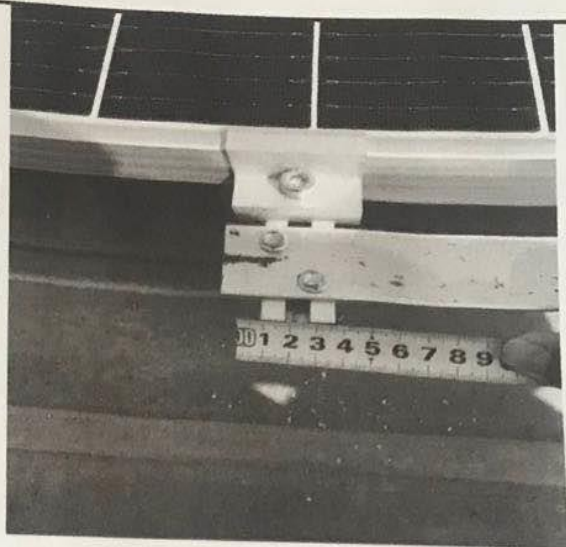


5、接地扁钢个别未防腐，扁钢需离开彩钢屋面



6、视频监控立柱未接地，电缆桥架内视频监控线缆接头不牢靠。

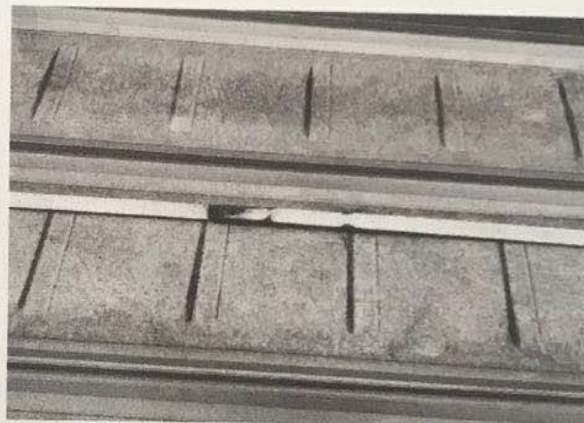


7、个别阵列边侧夹具间距超过 500mm 需增加夹具。 8、个别组件跨接接地线断开失效。

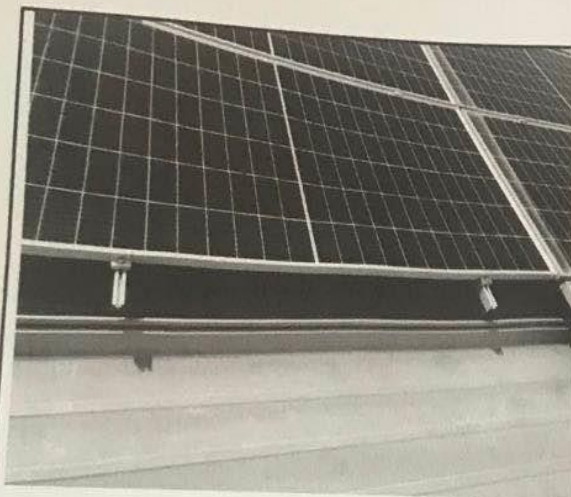

9、垂直桥架未按照规范要求间隔接地。

10、桥架内个别交流电缆有划伤需修复处理。

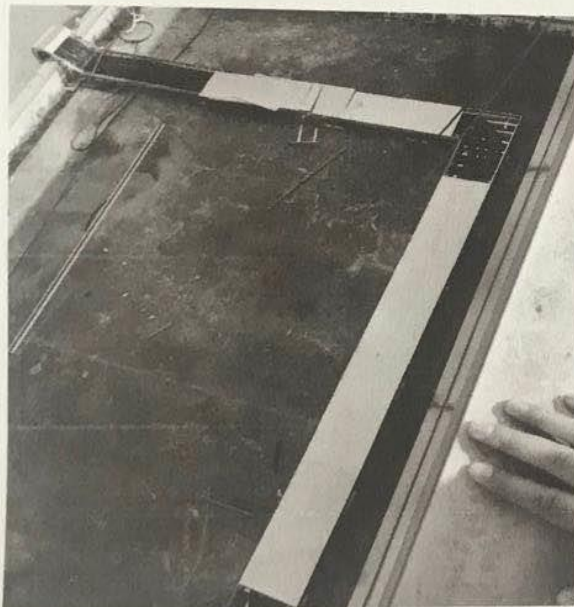

肥东县普枫蓝天新能源有限公司 1.4MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2020 年 04 月 01 日

