

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-028

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏 T11 立柱焊接偏离桩基较大事宜


内容：

你单位在光伏 T11 区立柱焊接过程中存在以下问题：

经监理现场巡视检查发现，你单位在光伏 T11 区立柱焊接过程中，由于桩基严重偏离，之前已进行多次施工交底（桩基偏差较大通知相关单位和监理人员到场确认整改后再进行施工），但你单位施工人员仍然进行焊接，导致立柱严重偏离桩基（附图），留下安全隐患。

现责令你单位立即停止局部焊接施工，整改符合要求后再进行立柱焊接。

限 2 日内回复

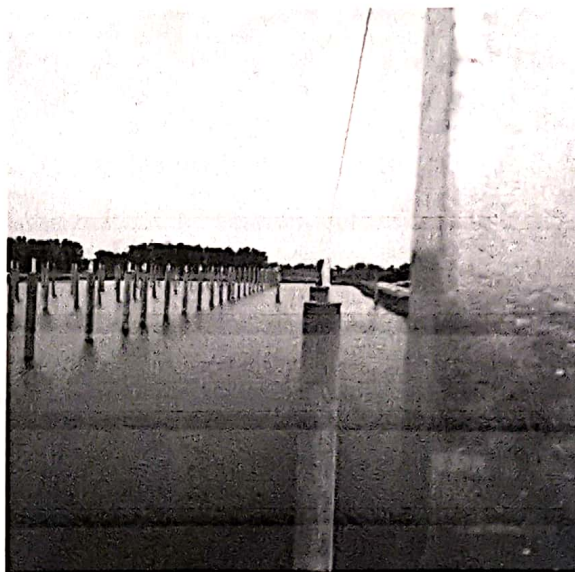

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建
