

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-032

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏区防雷接地及桩头防腐的事宜

内容：

你单位在防雷接地施工和桩头防腐施工中存在以下问题：

1. $\phi 16\text{mm}$ 圆钢之间搭接过程中搭接长度不够（圆钢搭接面为直径的 6 倍）（附图 1）。
2. 焊接不规范，表面不饱满（附图 2）。
3. $\phi 16\text{mm}$ 圆钢与立柱搭接长度不够（圆钢搭接面为直径的 6 倍）且工艺不美观（附图 3）。
4. 桩头防腐涂刷时，部分桩头铁件未除锈干净就进行底漆施工（附图 4）。

针对以上问题，望你单位规范施工，对以上问题立即整改。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。

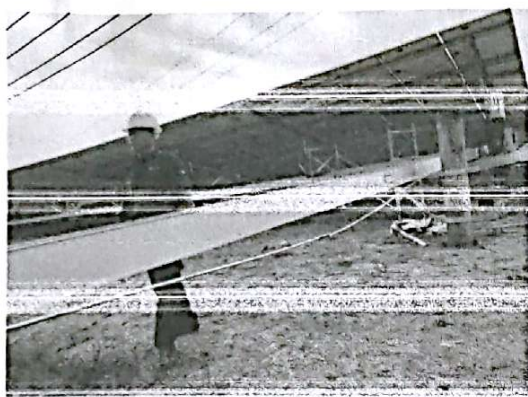


图 1



图 2

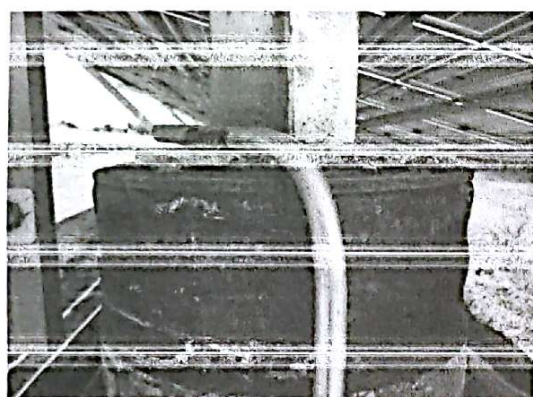


图 3

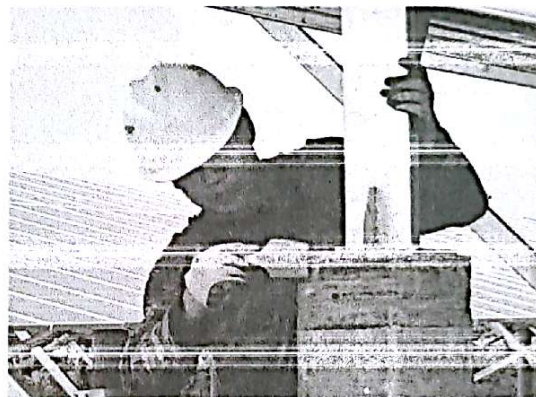


图 4
