

监 理 通 知 单

工程名称：安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-FYMJ-TZ003

致：安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部：

事由：关于现阶段施工的质量及安全问题

- 1、提交施工人员保险报审。
- 2、制胶车间维修走道，因为设计的缺陷不能按照设计完成，现场没有空隙安装走道板，要求给出解决方案，无法解决提出申请，由甲方决定扣除相应款项。
- 3、直流串线管，需要穿到位不得存在线缆暴露的情况。
- 4、屋面不得存在塑料绑扎带，使用年限太短。
- 5、禁止施工区域吸烟，如现场发现一次按照厂区规定罚款1000元。
- 6、屋面的安全防护工作必须做好做实，特别是临边防护，采光带防护，直立爬梯上下，支架分散平台搭建及人员安全防护等。
- 7、所有关键部位施工（特别是隐蔽工程）必须进行报验，经监理方验收合格方能进行下步工序施工，如未报验就施工所产生的质量问题将由你方承担责任及后果。
- 8、工期按照6月25日，你方已经违反工期，要求7月10日前必须完成全容量并网，同时做好工程资料报审，以及分项验收报审

针对以上问题请你项目部收到通知后认真对待，造成的后果将由你单位自行承担，待整改完毕应执行“三检”制度方可报监理验收，限期 3日内回复

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日 期： 年 月 日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

附件：

监理通知单问题清单

工程名称


安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目

一、现场问题：

制胶车间无空隙安装走道板




施工区域发现烟头

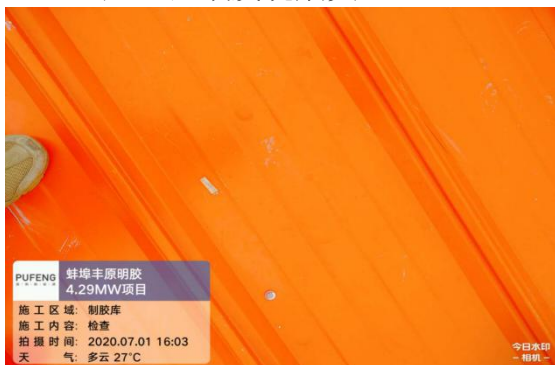

线缆暴露



施工区域发现烟头

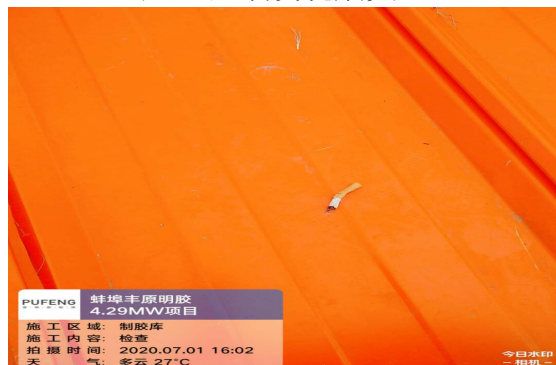

安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目

2020年7月3日

