

监 理 通 知 单

工程名称: 安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-FYMJ-TZ001

致: 安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部:

事由: 关于现阶段施工的质量问题

- 1、MC4 接头未捆扎存在拖地现象。
- 2、制胶车间屋面新瓦型个别出现拼接现象。
- 3、骨粒车间屋面彩光带未安装警戒带。
- 4、质量验收划分报审表未提供。
- 5、成品库支架未进行报验, 已进入下一道工序组件安装。
- 6、光伏组件安装施工进度已延误13天。

针对以上问题请贵项目部收到通知后认真对待, 如再出现此类情况, 造成的后果将由你单位自行承担, 待整改完毕应执行“三检”制度方可报监理验收, 限期 3日内整改完毕

附件: 监理通知单问题清单

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日期: 2020年6月11日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。



扫描全能王 创建

附件：


监理通知单问题清单

工程名称


安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目

一、现场问题：

- 1、组件下电缆及 MC4 接头存在拖地现象。 2制胶车间屋面新瓦形个别出现拼接现象。

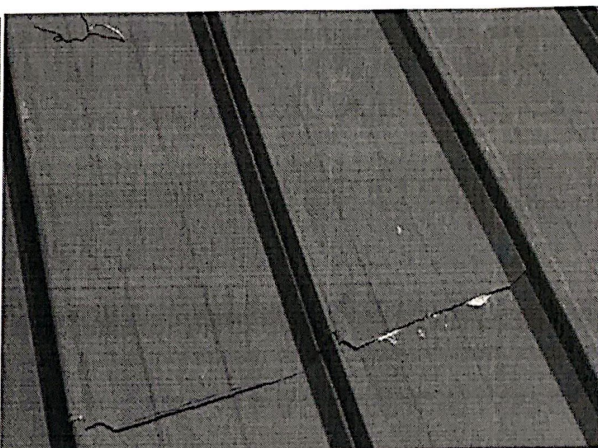

- 3、骨料车间屋面彩光带未安装警戒带。

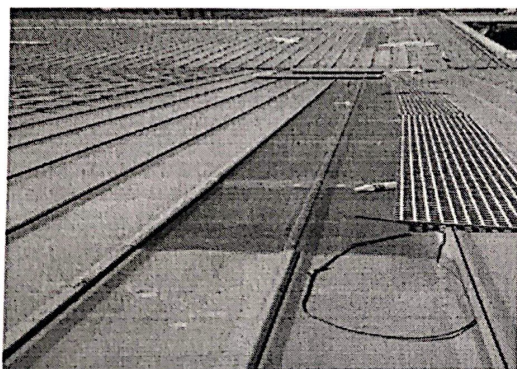

4、

安徽丰原明胶公司4.29mw屋顶分布式光伏发电项目

2020年05月19日



扫描全能王 创建
