

# 监理通知单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-015

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）

事由：关于一标段施工工序报审问题

内容：

我监理部现场巡视，发现你单位一标段 9#方阵，已开始支架基础混凝土浇筑，但至今，你单位未向监理部提交报审资料，严重违反了《建设工程质量管理条例》中第四章第三十条有关规定。给工程埋下了潜在的质量隐患，就此问题，要求你单位立即停工，待报验手续完善，监理部验收合格后，方可施工，否则，一切后果有你单位承担。

附：照片

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：张金星

日期：2020.7.25

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。



扫描全能王 创建

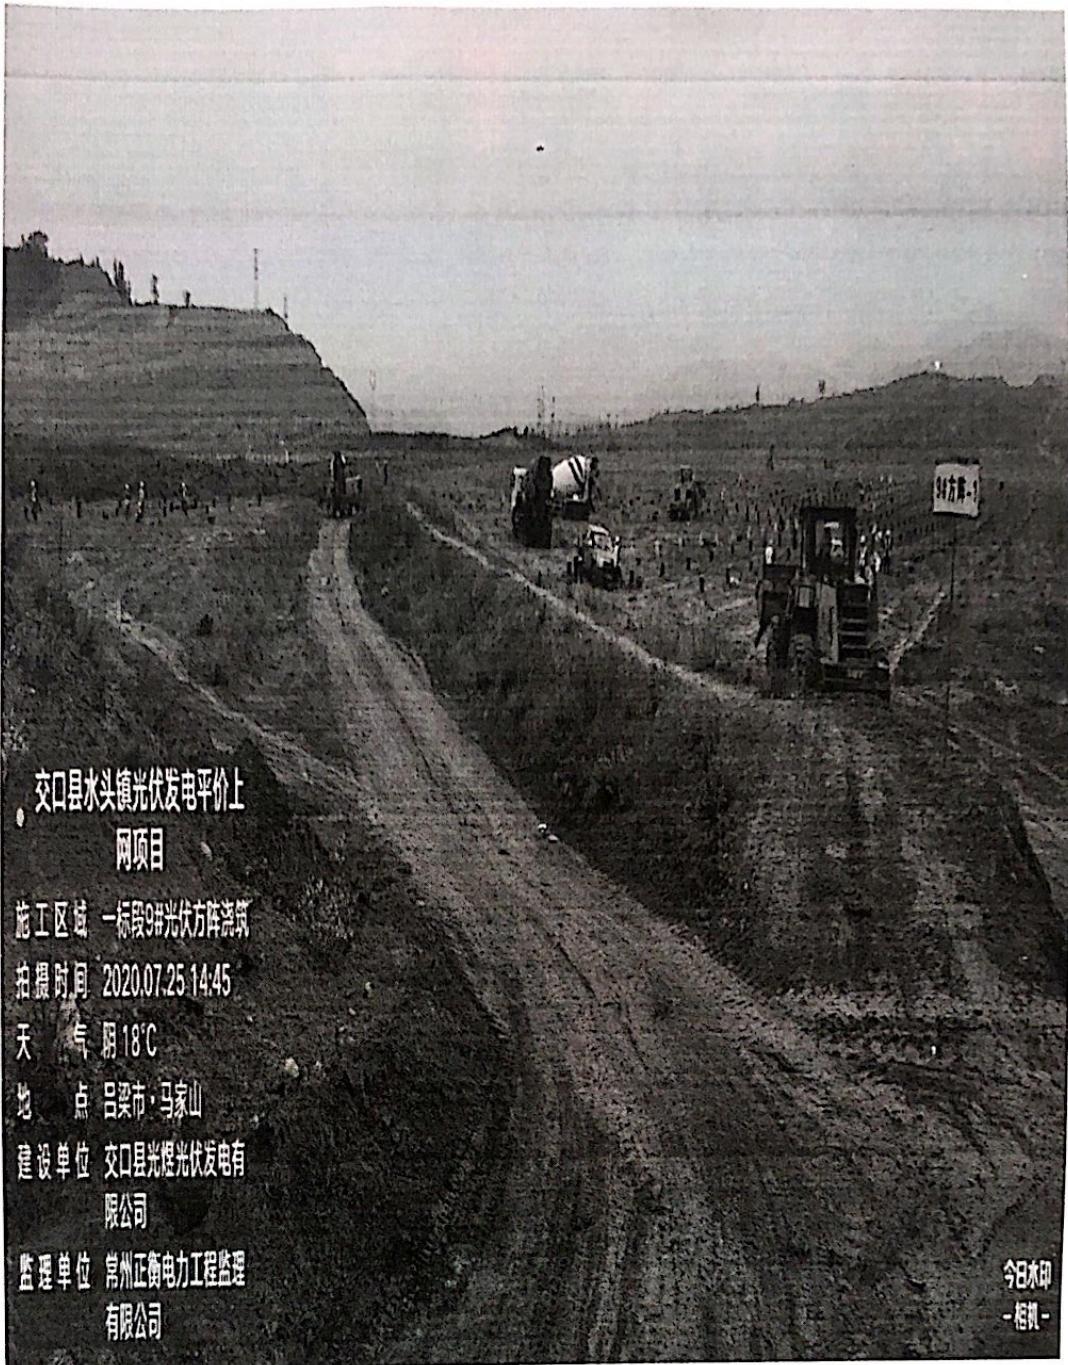

交口县水头镇光伏发电平价上网项目

施工区域 一标段9#光伏方阵浇筑

拍摄时间 2020.07.25 14:45

天 气 阴 18°C

地 点 吕梁市·马家山

建设单位 交口县光煜光伏发电有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印  
- 摄机 -



扫描全能王 创建
