

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目


编 号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-20210430

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电施工项目部

事由: 关于二次浇筑前清理不彻底的问题

内容:

监理巡视检查发现, 你部二次浇筑前对桩内清理不彻底, 前期清理的坑内部仍未清理到位, 仍有杂物和沉积泥浆未清理、双螺栓漏拧等。现下发整改通知单, 并按要求进行整改。如下图:

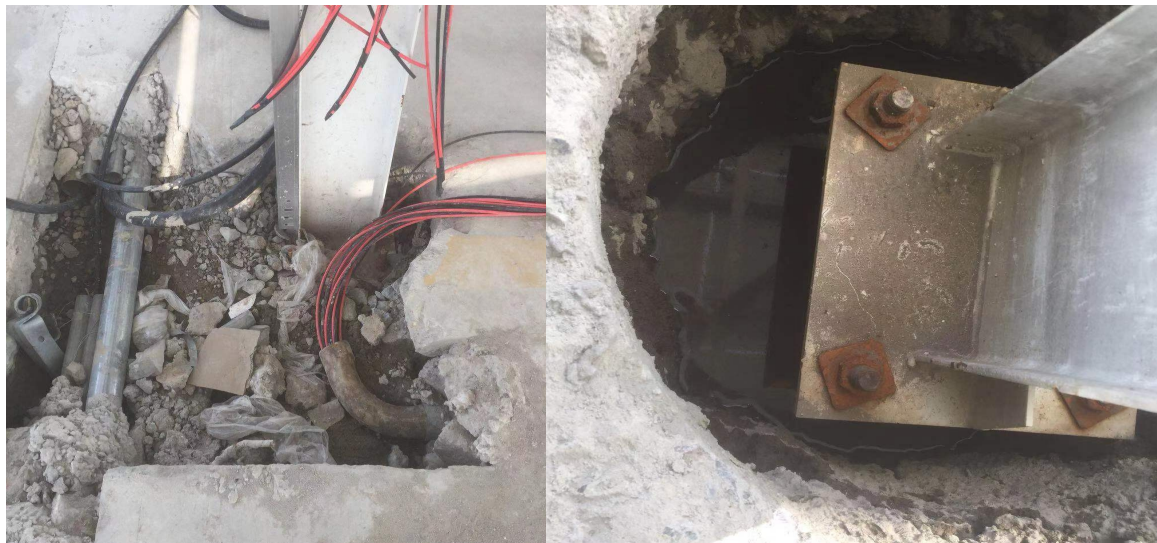

请你部接到通知后对存在问题的接线进行认真进行整改, 整改完成后回复上报监理部检查。未整改或整改不到位的, 经监理查验且不符合要求的, 不得浇筑混凝土。

整改限贰日

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日 期: 2021年4月30日

注 本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份
