

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-20210511

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部


事由: 关于三区少数桩基础深无法达到设计要求的问题

内容:

2021年5月11日上午, 监理人员对即将浇筑第三施工区的桩基础孔洞进行检查测量, 发现少数桩孔存在以下问题, 现下发《监理通知单》要求你部进行整改, 并在24小时内进行书面回复。

附存在的质量问题情况:

1、孔深约为500~700mm, 未清理到设计深度约1020mm要求(见图), 不符合设计图纸《上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目车棚骨架工程》图号G05基础详图中的要求。

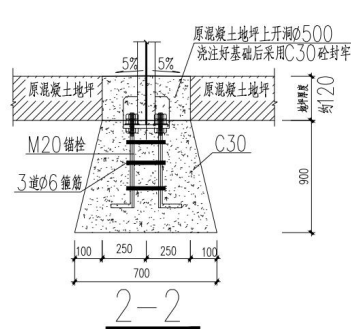

现要求你部必须按要求浇筑前完成整改并反馈, 举一反三, 桩基符合要求后再进行浇筑。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2021 年 5 月 11 日

注 本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存壹份, 监理项目部存壹份。
