

## 监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目


编号：ZHJL-JLTZ-010

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于电缆敷设及回填事宜

内容

经我方监理现场巡视发现贵单位在3号箱变附件的电缆施工未提前24小时报验我方进行隐蔽验收私自施工，现场检查发现汇集线路电缆线皮存在破损且已漏凯、电缆回填未按照图纸要求进行施工。现要求你方立即停止该段电缆回填工作，并对不合规范要求部位进行整改，在未完成整改前私自施工所造成的一切后果由你方负责。在该通知单在3个工作日内回复。（详情见附图）

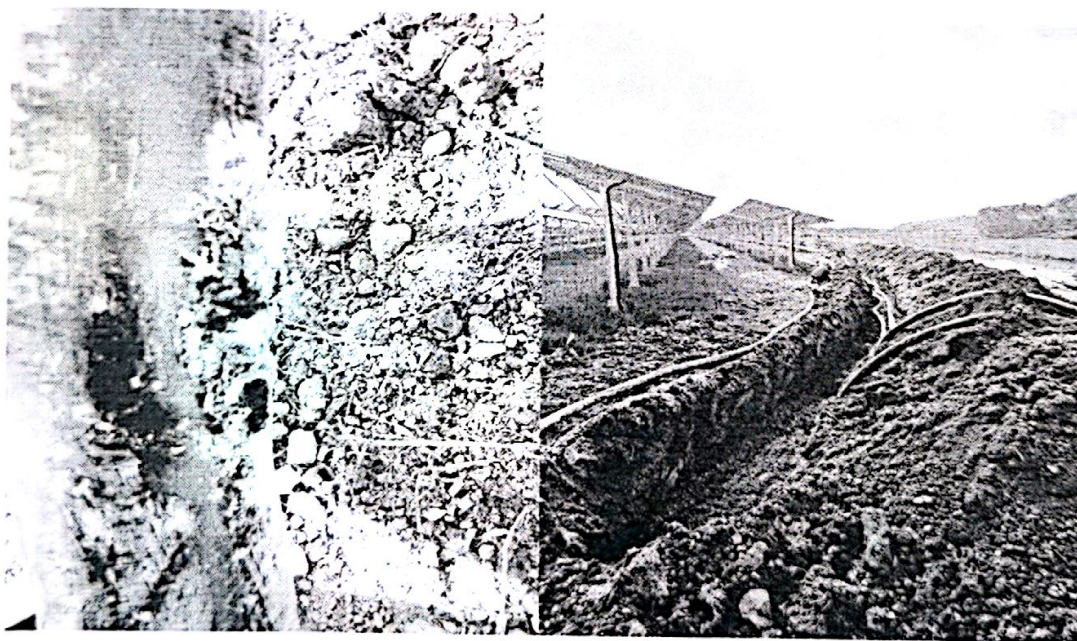

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2020年6月28日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。
