

监理工程师通知单

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-JLTZ-011

致：江苏长江环境科技工程有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目施工项目部

事由 关于接地施工事宜

内容

经我方监理现场巡视检查发现接地施工存在以下问题：

- 1、 接地引上线和支架底座焊接搭接面不足。
- 2、 接地沟内接地扁铁转角连接处搭接面不足
- 3、 接地扁铁未进行三面满焊接
- 4、 接地极数量缺少不符合规范要求。

望贵单位及时对以上问题进行整改，在完成整改并复检完成前不允许隐蔽。若贵单位私自隐蔽所产生的后果由你方自行承担。该通知单在 3 个工作日内回复。（详情见附图）

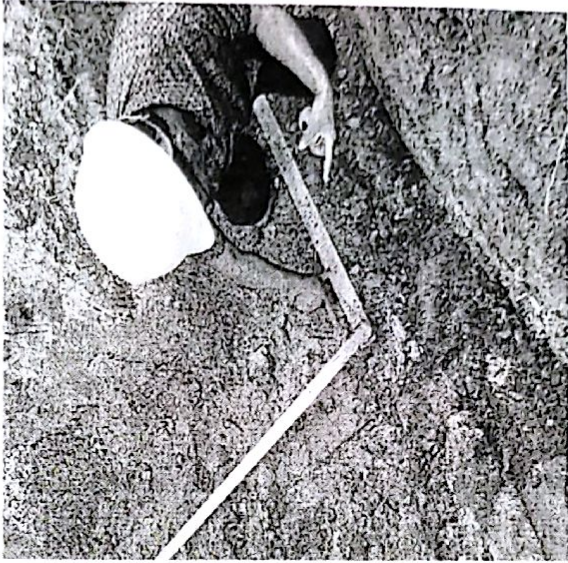
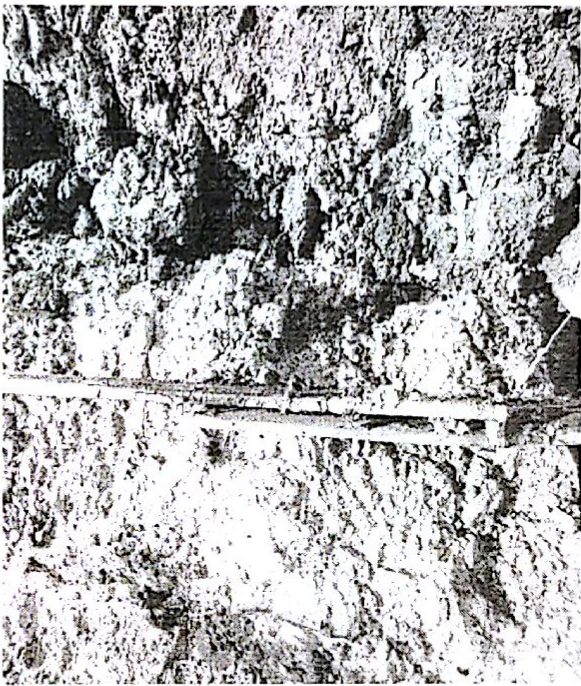
监理项目部（章）

总/专业监理工程师



日期：2020 年 7 月 1 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

接地引上线和支架底座焊接搭接面不足	接地极数量缺少不符合规范要求
	
接地沟内接地扁铁转角连接处搭接面不足	接地扁铁未进行三面满焊接
	

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。
